

【問い合わせ先】
岩手県復興局 (019-629-6935)

[illegible]

**基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)**

【問い合わせ先】
岩手県復興局 (019-629-6935)

1 年度別の整備スケジュール

※全ての箇所を網羅して記載

分野	概要	年度別整備スケジュール								
		第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連続期間)		
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
港湾・海洋	○ 45海岸で堤防・水門等の復旧・整備を実施 ○ 20河川で堤防・水門等の復旧・整備を実施	応急対策	施工準備(堤防設計等)				一部防潮堤等工事	一部水門工事		
		防潮堤、水門等の復旧・整備工事								
農地・海洋	○ 16海岸で防潮堤・防災林等の復旧・整備を実施	応急対策	施工準備(堤防設計等)				防災林造成工事(高田松原地区)			
		防潮堤・防災林等の復旧・整備工事								
漁港・海洋	○ 54海岸(県25海岸、市町村29海岸)で防潮堤等の復旧・整備を実施	応急対策	施工準備(堤防設計等)							
		防潮堤等の復旧・整備工事								
復興まちづくり	○ 18地区で土地区画整理事業を実施 ○ 54地区で防災集団移転事業を実施 ○ 10地区で津波復興拠点整備事業を実施 ○ 40地区で産業集落防災機能強化事業を実施 ○ 8路線で街路を整備 ○ 18路線の34区画(箇所)で手づくりと連携した道路を整備	事業準備・住民合意(復興計画策定等)								
		事業計画手続き等(都市計画決定等)								
		調査・設計・工事等				工事進捗にあわせ順次住宅建設				
		設計・工事等 土地区画整理等と合わせて実施								
		施工準備(測量設計等)				測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(逐次供用開始)				
復興道路	○ 3路線の29区画(箇所)で復興道路を整備	(H23新規着手)	事業準備	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(逐次供用開始)						
		(事業中) 用地・工事の推進(逐次供用開始)								
復興交通道路	○ 8路線の8区画(箇所)で復興交通道路を整備	(H24新規着手)	施工準備(設計・用地等)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(逐次供用開始)						
		(事業中) 用地・工事の推進(逐次供用開始)								
復興関連道路	○ 15路線の16区画(箇所)で復興関連道路を整備	(H24新規着手)	施工準備(設計・用地等)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
		(H24新規着手)	施工準備(設計・用地等)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
災害公営住宅	○ 県及び市町村の全体で、0.086戸の災害公営住宅を整備	(県) 用地								
		(県) 設計								
		工事(2,905戸の整備を予定)								
		用地								
漁港	○ 108漁港(県31漁港、市町村77漁港)で防波堤、岸壁の復旧・整備を実施	(市町村) 設計								
		工事(3,181戸の整備を予定)								
		用地								
		設計								
港湾	○ 6港湾(重要港湾4港湾、地方港湾2港湾)で湾口防波堤、岸壁、物揚場などの復旧・整備を実施	応急対策	施工準備(堤防設計等)				湾口防波堤の復旧・整備工事(釜石港、大船渡港)			
		防波堤、岸壁等の復旧・整備工事				(宮古港)				
		施工準備								
		湾口防波堤の復旧・整備工事(釜石港、大船渡港)				(宮古港)				
医療	○ 県立病院3箇所、市町村立医師診療所3箇所の整備を実施	暫定供用				一部物揚場、臨港道路等				
		防波堤、岸壁等の復旧・整備工事								
		建設場所選定				高田病院の整備スケジュールは建設場所選定後に決定				
		用地・設計・工事(大槌病院、山田病院)								
教育	○ 県立高専等学校1箇所、市町村立小中学校17箇所の整備を実施(協議、調整中のものを含む)	(市町村) 事業準備・住民合意				用地・設計・工事				
		用地取得・設計・造成工事				設計・校舎・体育館等建設				

2 市町村別 事業計画掲載箇所数等一覧

※赤字は前回からの変更箇所

市町村名	事業主体	海岸保全施設				復興まちづくり								復興道路等			災害公営住宅	漁港	港湾	医療	教育			
		一般海岸 港湾海岸	農地海岸 林野海岸	漁港海岸	計	土地区画 整理	防災集団 移転	津波復興 拠点	漁業集落 防災	面整備計	街路整備	まちづくり 連携道路	復興道路	復興支線道路	復興関連道路									
		河川・海岸数	海岸数	海岸数	河川・海岸数	地区数	地区数	地区数	地区数	地区数	路線数	箇所数				路線数						区間・箇所数	路線数	区間・箇所数
洋野町	県	6	0	1	7	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	0	0	1	2	-	-
	町	-	-	0	0	0	0	0	1	1	-	-		(国)1	-	-	-	-	1	4	8	-	-	-
	計	6	0	1	7	0	0	0	1	1	-	1		1	0	0	1	1	1	4	9	2	-	-
久慈市	県	5	0	1	6	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	1	1	2	2	0	0	1	4	-	-
	市	-	-	2	2	0	0	0	4	4	-	-		(国)2	-	-	-	-	3	11	9	(国)1	-	-
	計	5	0	3	8	0	0	0	4	4	-	-		2	1	1	2	2	3	11	10	5	-	-
野田村	県	6	2	0	8	-	-	-	-	-	-	2	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	2	26	1	-	-	-
	村	-	-	0	0	1	1	0	2	4	-	-		(国)1	-	-	-	-	4	76	2	-	-	-
	計	6	2	0	8	1	1	0	2	4	-	2		1	0	0	1	1	6	102	3	-	-	-
普代村	県	4	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-
	村	-	-	0	0	0	0	0	1	1	-	-		(国)3	-	-	-	-	0	0	3	-	-	-
	計	4	0	0	4	0	0	0	1	1	-	-		3	0	0	0	0	0	0	5	-	-	-
田野畑村	県	2	0	1	3	-	-	-	-	-	-	3	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	2	0	0	1	-	-	-
	村	-	-	1	1	0	0	0	2	2	-	-		(国)3	-	-	-	-	5	68	3	-	-	-
	計	2	0	2	4	0	0	0	2	2	-	3		3	0	0	1	2	5	68	4	-	-	-
岩泉町	県	2	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	1	2	0	0	0	0	1	1	-	-
	町	-	-	1	1	0	0	0	1	1	-	-		(国)1	-	-	-	-	2	51	1	-	1	2
	計	2	0	2	4	0	0	0	1	1	-	-		1	1	2	0	0	2	51	2	1	1	2
宮古市	県	13	2	2	17	-	-	-	-	-	-	7	三陸沿岸道 路、宮古港 復興幹線道路	1	1	3	2	2	10	371	3	7	-	-
	市	-	-	3	3	3	5	2	9	19	-	-		(国)7	-	-	-	-	12	422	15	(国)1	1	2
	計	13	2	5	20	3	5	2	9	19	-	7		8	1	3	2	2	22	793	18	8	1	2
山田町	県	4	3	4	11	-	-	-	-	-	1	1	三陸沿岸 道路	-	1	1	1	1	9	547	4	-	1	-
	町	-	-	1	1	3	4	1	2	10	-	-		(国)2	-	-	-	-	10	284	2	-	-	1
	計	4	3	5	12	3	4	1	2	10	1	1		2	1	1	1	1	19	831	6	-	1	1
大槌町	県	2	1	2	5	-	-	-	-	-	4	1	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	5	500	2	-	1	-
	町	-	-	0	0	4	6	2	4	16	-	-		(国)1	-	-	-	-	11	480	0	-	-	2
	計	2	1	2	5	4	6	2	4	16	4	1		1	0	0	1	1	16	980	2	-	1	2
釜石市	県	6	3	5	14	-	-	-	-	-	1	7	三陸沿岸道 路、東北横 断自動車道 釜石四ツ目 交流道	-	1	1	3	3	4	198	6	1	-	-
	市	-	-	7	7	4	11	2	13	30	-	-		(国)3	-	-	-	-	21	1220	9	(国)1	-	4
	計	6	3	12	21	4	11	2	13	30	1	7		3	1	1	3	3	25	1418	15	2	-	4
大船渡市	県	7	3	5	15	-	-	-	-	-	1	5	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	10	563	6	6	-	-
	市	-	-	8	8	1	22	1	1	25	-	-		(国)2	-	-	-	-	13	265	16	(国)1	-	3
	計	7	3	13	23	1	22	1	1	25	1	5		2	0	0	1	1	23	828	22	7	-	3
陸前高田市	県	8	2	3	13	-	-	-	-	-	1	7	三陸沿岸 道路	-	0	0	2	2	7	700	3	-	1	1
	市	-	-	6	6	2	5	2	0	9	-	-		(国)2	-	-	-	-	6	300	9	-	1	3
	計	8	2	9	19	2	5	2	0	9	1	7		2	0	0	2	2	13	1000	12	-	2	4
全体	県	65	16	25	106	0	0	0	0	0	8	34	3路線	1	5	8	15	16	47	2905	31	21	3	1
	市町村	0	0	29	29	18	54	10	40	122	0	0		(国)28	-	-	-	-	88	3181	77	(国)4	3	17
	計	65	16	54	135	18	54	10	40	122	8	34		29	5	8	15	16	135	6086	108	25	6	18

社会資本の復旧・復興ロードマップの見方

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

事業箇所位置図(久慈市の例)

新たな視点による 新たなまちづくり

■事業名・箇所名等

- 海岸保全施設と漁港は、海岸・漁港名と主な工種を記載。
- 復興道路等は、路線名及び箇所・区間名を記載。
- 復興まちづくりは、事業名及び箇所・地区名を記載。
- 災害公営住宅は、事業名及び団地名を記載

■事業の計画位置等

- 各事業の計画・検討区域や実施区域の、位置や範囲を図形記号(凡例参照)で表示。
- 図形記号の中の数字等は、工程表の「路線・箇所名等」欄の数値等と一致する。

■復興道路の概略ルート

国が整備を進めている三陸沿岸道路等の概略ルートを表示。(地図の縮尺を任意で調整しているため、国の公表資料と異なる場合がある。)

凡 例	
	3.11 浸水区域
	海岸保全施設
	復興道路等
	復興まちづくり
	災害公営住宅
	漁 港

■凡例

工程表に記載した各事業を図形記号で表示。

■地形図

様式のサイズに合わせて、地形図の縮尺を任意で調整しているため、実際の距離等とは一致しない。

工程表(宮古市の例から抜粋表示)

■分野区分

県民生活に身近な主要8分野を記載。

■海岸保全施設の細分項目

- 港湾海岸は、港湾区域に隣接するなど、港湾管理者が管理する海岸。
- 農地海岸は、背後に農地を有する海岸。
- 林野海岸は、防潮林などの保安林を有する海岸。
- 漁港海岸は、漁港区域に隣接するなど、漁港管理者が管理する海岸。
- 一般海岸は、上記以外の海岸のうち、海岸保全区域に指定された海岸。

■基準日(平成25年7月31日現在)
基準日の目安を赤線で表示。

■終期(二重表示)
終期が平成30年度以降となる場合、二重に表示。

■道路の種別
(主)は主要地方道、
(一)は一般県道。

■トピック
復興工事の完了や復興道路の供用、
公営住宅の入居開始等を記載。

■住宅再建の時期

年度ごとの住宅・宅地供給数を記載。
『民』自力再建等の宅地数
『公』災害公営住宅の戸数

■まちづくりと災害公営住宅の関連

復興まちづくり(面整備事業)と災害公営住宅の関連を記載。
『単独』災害公営住宅を単独事業として実施
『●●地区』復興まちづくりと一体的に実施

■災害公営住宅の整備手法

- 『直接建設』直接整備を実施
- 『設計・施工一括選定』設計・施工業者を一括選定
- 『買取』民間事業者が建設した公営住宅を買い取り
- 『敷地提案型買取』民間事業者が提案した敷地と共に公営住宅を買い取り


■工事の着手と完成
工事に着手した箇所は★、
完成した箇所は☆を表示。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 【洋野町】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先 【県】県北広域振興局土木部(0194-53-4990)
同 水産部(0194-53-4985)
【町】洋野町建設課(0194-77-2114)

海と高原の絆、未来へ 確かな復興

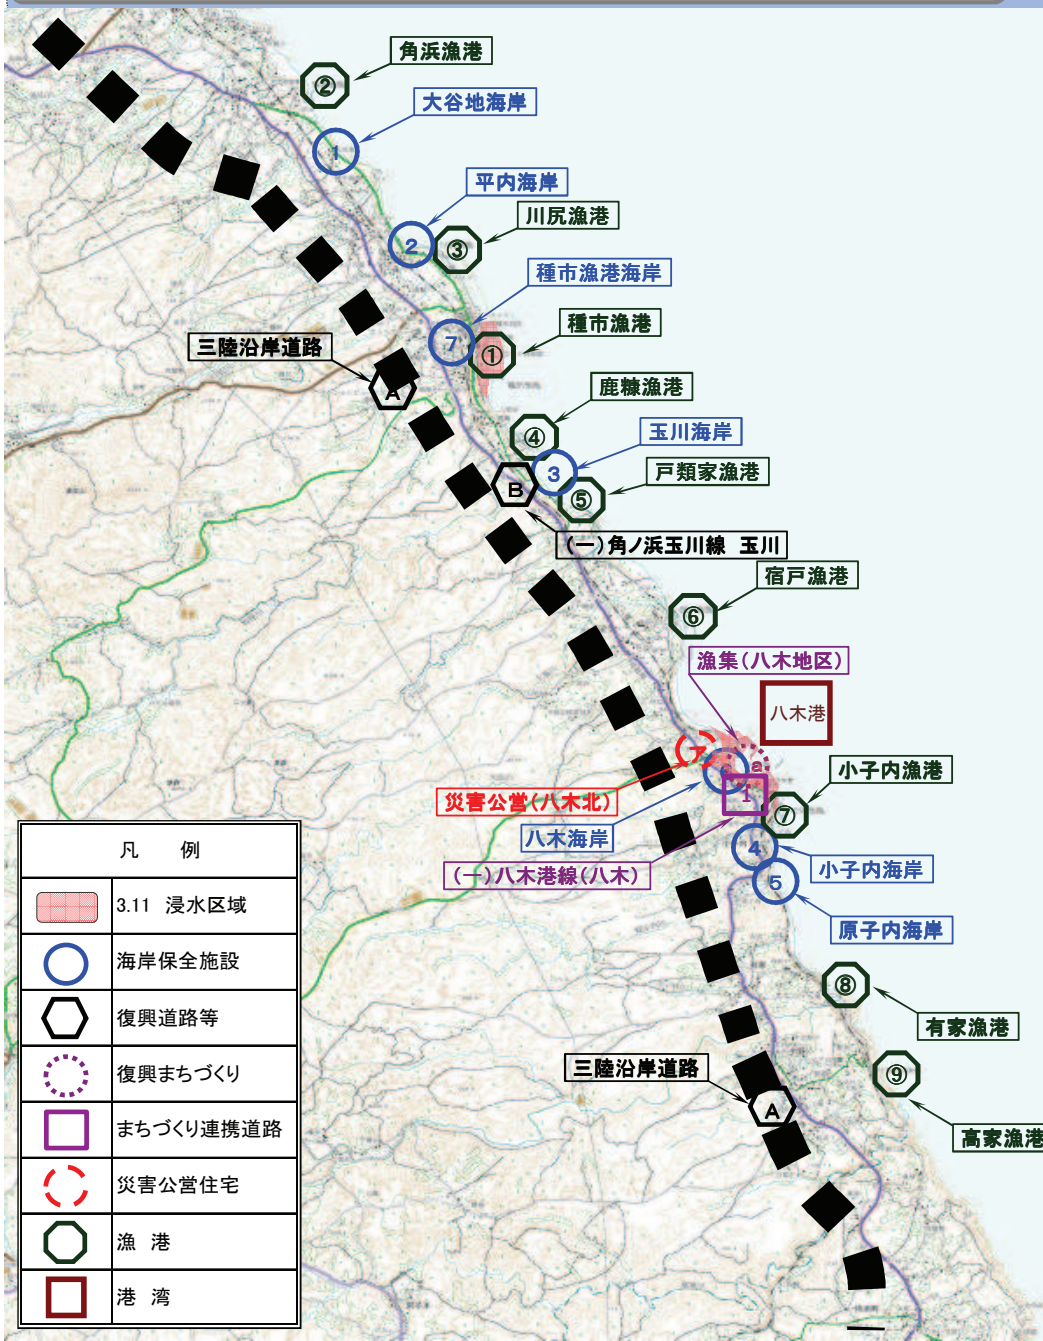


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への継続期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大谷地海岸	(災害復旧) 根固工V=92m ³ 他	施工準備	☆工事	■H24.12完了							
			2 平内海岸	(災害復旧) 消波工L=220m	施工準備	☆工事								
			3 玉川海岸	(災害復旧) 護岸L=87m 他	施工準備	☆工事	■H24.11完了							
			4 小内海岸	(災害復旧) 監視カメラ1台 他	施工準備	☆工事	■H24.8完了							
			5 原子内海岸	(災害復旧) 根固工V=92m ³ 他	施工準備	☆工事	■H24.5完了							
			6 八木海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km、水門等N=3基	施工準備									
	漁港海岸		7 種市漁港海岸	(災害復旧) 陸間N=1基、水門N=1基 他	☆工事	■H24.3完了								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	待浜～階上	(H23新規) 事業準備	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(逐次供用開始)								
	復興関連道路	県	B (一) 角ノ浜玉川線	玉川		(H25新規) 施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 八木	用地造成他 対象戸数:17戸(民17戸)	事業準備	設計、用地等	工事							
	まちづくり連携道路	県	1 (一)八木港線	八木		施工準備	工事の推進							
災害公営住宅	直接建設	町	A 八木北(単独)	木造平屋 戸数:4戸	用地	設計	☆工事							
漁 港	漁 港	町	① 種市漁港	(漁港災害) 防波堤L=106m 他	施工準備	☆工事	■H24.9完了							
			② 角浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=10m	☆工事	■H24.3完了								
			③ 川尻漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	施工準備	☆工事	■H24.3完了							
			④ 鹿糠漁港	(漁港災害) 船揚場L=22m 他	施工準備	☆工事	■H24.3完了							
			⑤ 戸類家漁港	(漁港災害) 船揚場N=1式	施工準備	☆工事	■H24.3完了							
			⑥ 宿戸漁港	(漁港災害) 防波堤L=69m、船揚場L=8m 他	施工準備	☆工事	■H24.12完了							
			⑦ 小内漁港	(漁港災害) 防波堤L=101m、岸壁L=14m 他	施工準備	☆工事	■H25.1完了							
			⑧ 有家漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m 他	施工準備	☆工事	■H25.1完了							
			⑨ 高家漁港	(漁港災害) 防波堤L=45m 他	施工準備	☆工事	■H24.11完了							
			北港地区	(災害復旧) 防波堤L=162m、-4.5m岸壁L=159m、護岸防波(1)(2)L=321.2m 他	暫定供用	☆防波堤、☆物揚場、☆臨港道路	★航路・泊地波深							
港 湾	八木港	県	南港地区	(災害復旧) 第2防波堤L=13m、1号護岸L=57.8m	暫定供用	☆防波堤、☆護岸	★航路・泊地波深							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数です。

**基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)**

同 水産部(0194-53-4985)
【市】久慈市総務部復興推進課(0194-54-8005)


新たな視点による 新たなまちづくり

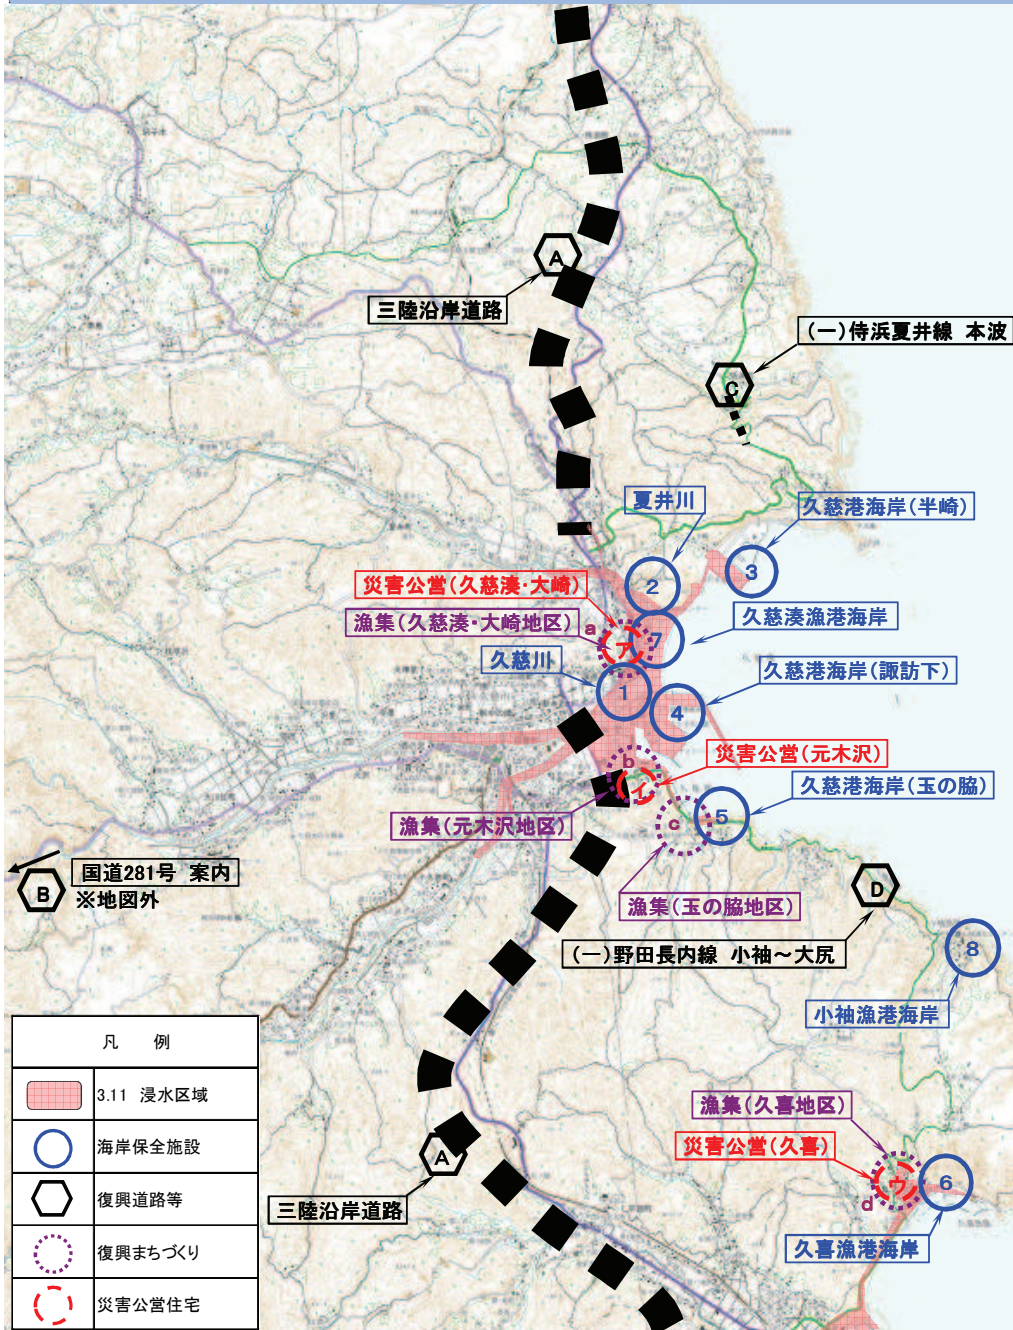

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への準備期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	施工準備		工事						
			2 夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	施工準備		工事						
	港湾海岸		3 久慈港海岸(半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	施工準備	☆工事	■H24.10完了						
			4 久慈港海岸(諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、陸間N=12基	施工準備		★工事						
	漁港海岸		5 久慈港海岸(玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	施工準備	☆工事	■H24.10完了						
			6 久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基、他	応急対策	施工準備	★工事						
			7 久慈湊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=4基	応急対策	施工準備	★工事						
			8 小袖漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基、他		施工準備	工事						
復興道路等	復興支援道路	国	久慈北道路	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			菅代～久慈	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始) ◆H25.6.27起工式								
	復興関連道路		B 国道281号	案内	(H24新規) 施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
			C (一) 侍浜夏井線	本波	(事業中) ☆用地・工事の推進	■H24.9.30供用開始							
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	D (一) 野田長内線	小袖～大尻	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)							
			a 久慈湊・大崎	集落道、避難施設、用地造成 他 対象戸数:14戸 (民9戸・公5戸)	事業準備	設計・用地等	★工事 (集団移転に関してはH25完了予定)						
			b 元木沢	集落道、避難施設、用地造成 他 対象戸数:5戸 (民2戸・公3戸)	事業準備	設計・用地等	★工事						
			c 玉の脇	集落道、用地造成 他 対象戸数:3戸 (民3戸)	事業準備	設計・用地等	★工事						
		d 久喜	集落道、漁業集落排水、用地造成 他 対象戸数:4戸 (民1戸・公3戸)	事業準備	設計・用地等	★工事							
		直接建設	市	ア 久慈湊・大崎 (漁:久慈湊・大崎地区)	木造 予定戸数:5戸	用地・造成		5戸	設計	工事			
				イ 元木沢 (漁:元木沢地区)	木造 予定戸数:3戸	用地・造成		3戸	設計	工事			
				ウ 久喜 (漁:久喜地区)	木造 予定戸数:3戸	用地・造成		3戸	設計	工事			

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
 ※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

新たな視点による 新たなまちづくり

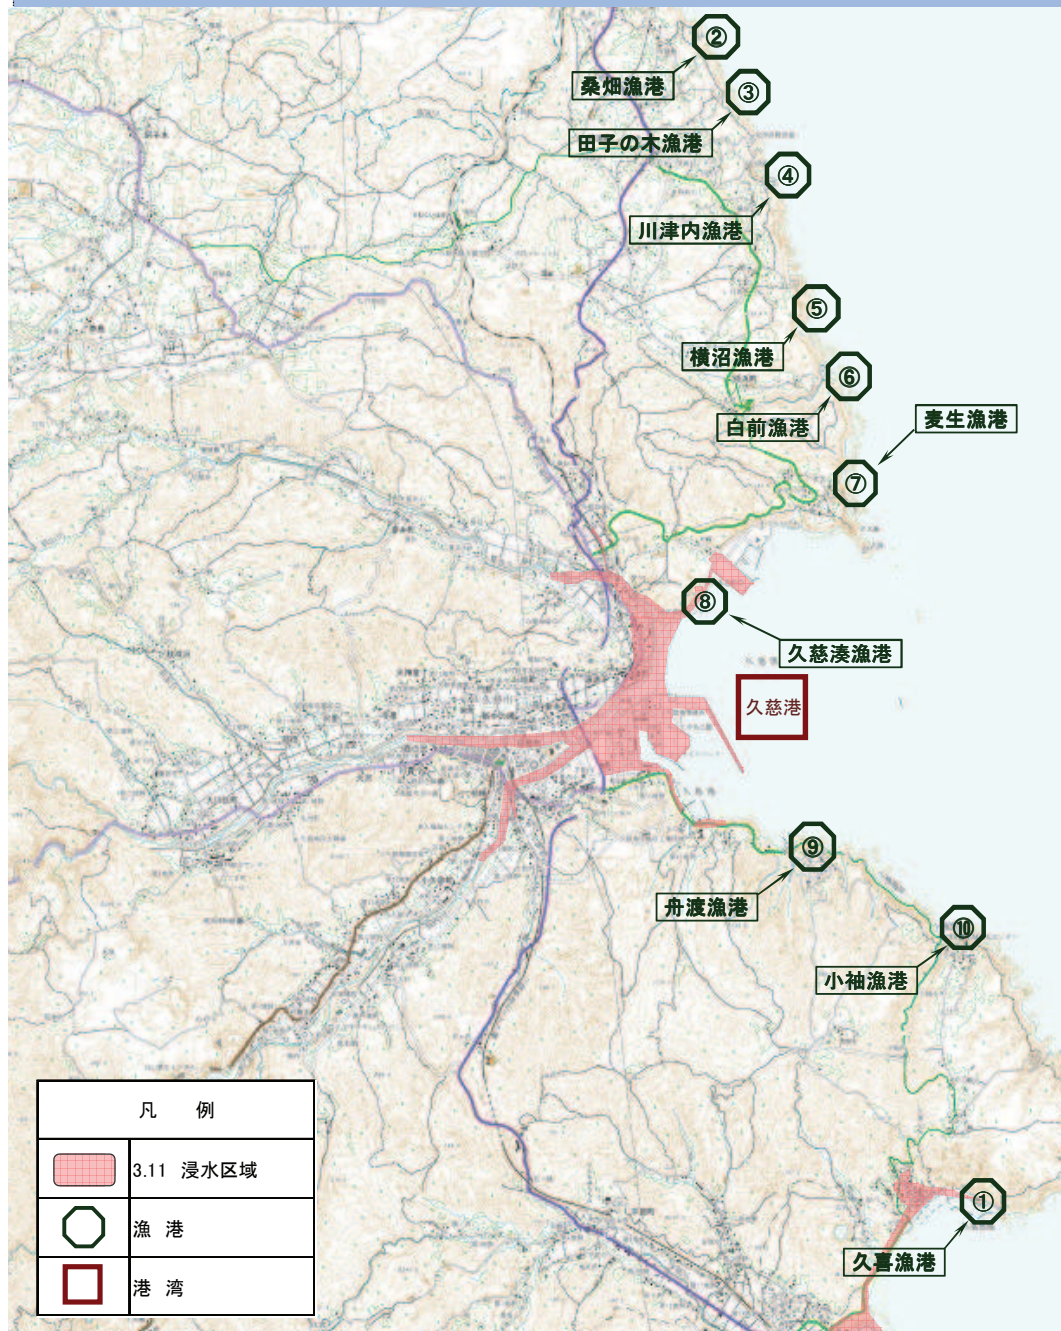

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
漁港	漁港	県	① 久喜漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、岸壁L=93m 他	施工準備 応急対策	☆工事		■H25.7完了						
			② 桑畑漁港	(漁港災害) 用地N=1式 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H24.1完了							
		市	③ 田子の木漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H23.8完了							
			④ 川津内漁港	(漁港災害) 防波堤L=11m 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H24.3完了							
			⑤ 横沼漁港	(漁港災害) ~3m岸壁N=1式 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H24.3完了							
			⑥ 白前漁港	(漁港災害) 防波堤L=29m 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H24.3完了							
			⑦ 麦生漁港	(漁港災害) 物揚場N=1式 他	施工準備 応急対策	☆工事	■H24.3完了							
			⑧ 久慈湊漁港	(漁港災害) 航路N=1式	施工準備 ☆応急対策		■H23.9完了							
			⑨ 舟渡漁港	(漁港災害) 護岸L=64m 他	施工準備 応急対策	☆工事		■H24.5完了						
			⑩ 小袖漁港	(漁港災害) 防波堤L=150m 他	施工準備 応急対策	☆工事		■H24.7完了						
港湾	久慈港	国	湾口防波堤	(防波堤整備・直轄災害復旧) 防波堤L=3,800m	★工事(平成40年度完成目標)									
			堀込地区	(災害復旧) ~4.5m岸壁L=180m、~6.0m岸壁L=497m、~2.0m物揚場L=105m	暫定供用	☆岸壁、☆物揚場	★航路・泊地深瀬							
			諏訪下地区	(災害復旧) 諏訪下防波堤L=50m、外防波堤L=293m、~7.5m岸壁L=281.6m、~10.0m岸壁L=23.7m	暫定供用	☆防波堤、☆岸壁、☆臨港道路	★航路・泊地深瀬							
			玉の脇地区	(災害復旧) 外防波堤L=297m、北防波堤L=152m、内防波堤L=95m、物揚場L=51m	暫定供用	★防波堤、☆物揚場、☆臨港道路	★航路・泊地深瀬							
			半崎地区	(災害復旧) 半崎防波堤L=23m、波除堤L=40m、~4.0m物揚場L=69m、船揚場L=48m	暫定供用	★防波堤、★物揚場、☆臨港道路、★船揚場	★航路・泊地深瀬							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。


社会資本の復旧・復興ロードマップ

【野田村】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

安全・安心で活力あるむらづくり

問い合わせ先【県】 県北広域振興局(0194-53-〔以下のとおり〕)
土木部(4990)、林務部(4984)、水産部(4985)
農政部農村整備室(4988)
【村】 野田村復興むらづくり推進課(0194-78-2915)

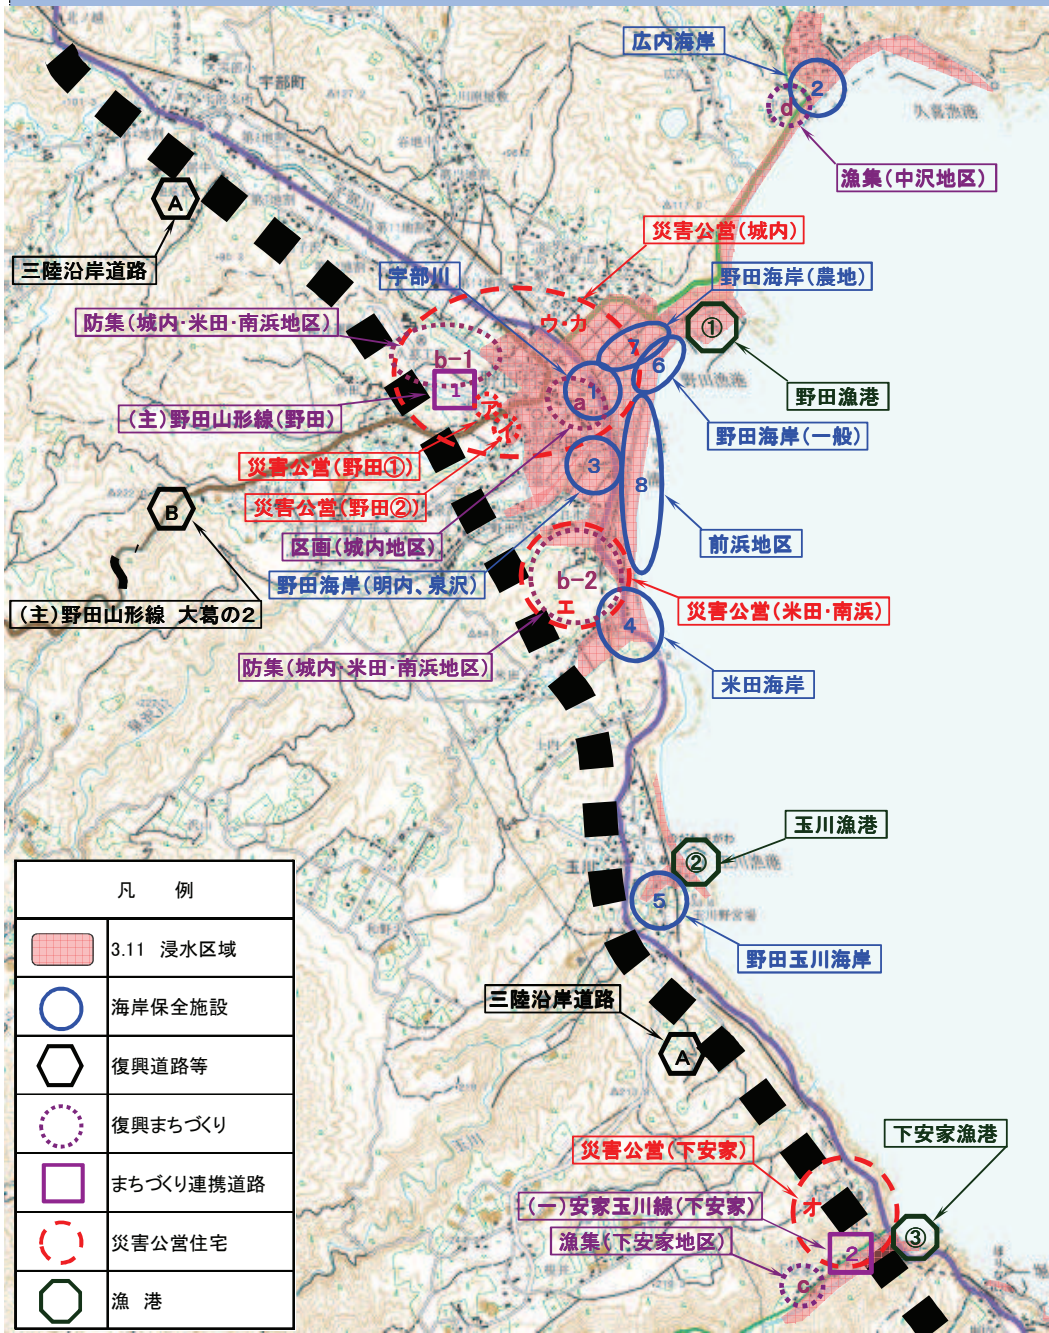

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる復興への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	施工準備	★工事								
			2 広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門等N=4基他	施工準備	★工事								
			3 野田海岸(明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	施工	★工事	■H25.3完了							
			4 米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門等N=2基他(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	施工準備	★工事								
			5 野田玉川海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.05km他	施工準備	★工事	■H25.5完了							
			6 野田海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km、水門等N=1基	施工準備	★工事								
	農地海岸	県	7 野田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏面A=2,320m ² 、水門操作室N=1棟	施工準備	★工事	■H24.8完了							
	林野海岸		8 前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km	応急対策	施工準備	★工事							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	替代～久慈	(H23新規)	事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(逐次供用開始) (H25.6.27起工式)							
	復興関連道路	県	B (主) 野田山形線	大葛の2	★用地・工事の推進(逐次供用開始)		■H25.7.2供用開始							
復興まちづくり	土地区画整理	県	a 城内地区	区域面積:12.9ha 対象戸数:135戸(民121戸・公11戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等					民121戸 公11戸			
			b-1 城内・米田・南浜地区(城内地区)	対象戸数:77戸(民22戸・公55戸)	事業準備・住民合意	調査・設計等	★工事				民22戸 公55戸			
	防災集団移転	村	b-2 城内・米田・南浜地区(米田・南浜地区)	対象戸数:24戸(民18戸・公6戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	★工事				民18戸 公6戸			
			c 下安家地区	集落道、用地造成他 対象戸数:14戸(民13戸・公1戸)	事業準備	設計、用地等	★工事				民13戸 公1戸			
	漁業集落防災機能強化	村	d 中沢地区	用地造成他 対象戸数:2戸(民2戸)	事業準備	設計、用地等	★工事				民2戸			
			1 (主)野田山形線	野田		施工準備	★用地・工事の推進							
	まちづくり連携道路	県	2 (一)安家玉川線	下安家		施工準備	用地買収	★用地・工事の推進						
			ア 野田①(単独)	木造2階 予定戸数:8戸	用地	設計 ★工事	■H25.3完了							
災害公営住宅	直接建設	県	イ 野田②(単独)	木造平屋 予定戸数:18戸	用地	設計	★工事							
			ウ-1 城内(区・城内地区)	木造 予定戸数:11戸	用地・造成			設計	★工事					
			ウ-2 城内(防・城内地区)	木造 予定戸数:55戸	用地・造成				設計	★工事				
			エ 米田・南浜(防・米田・南浜地区)	木造 予定戸数:6戸	用地・造成			設計	★工事					
			オ 下安家(漁・下安家地区)	木造 予定戸数:1戸	用地・造成				設計	★工事				
			カ 城内(単独)	木造 予定戸数:3戸	用地				設計	★工事				
			① 野田漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、岸壁L=307m 他	施工準備	★工事								
			② 玉川漁港	(漁港災害) 防波堤L=132m、岸壁L=50m 他	施工準備	★工事	■H24.9完了							
漁港	漁港	村	③ 下安家漁港	(漁港災害) 防波堤L=28m 他	施工準備	★工事	■H24.9完了							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。


社会資本の復旧・復興ロードマップ

【普代村】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先 【県】県北広域振興局土木部(0194-53-4990)
同 水産部(0194-53-4985)
【村】普代村建設水産課 (0194-35-2116)

あすへの一步 青い海(水産業)の復興へ

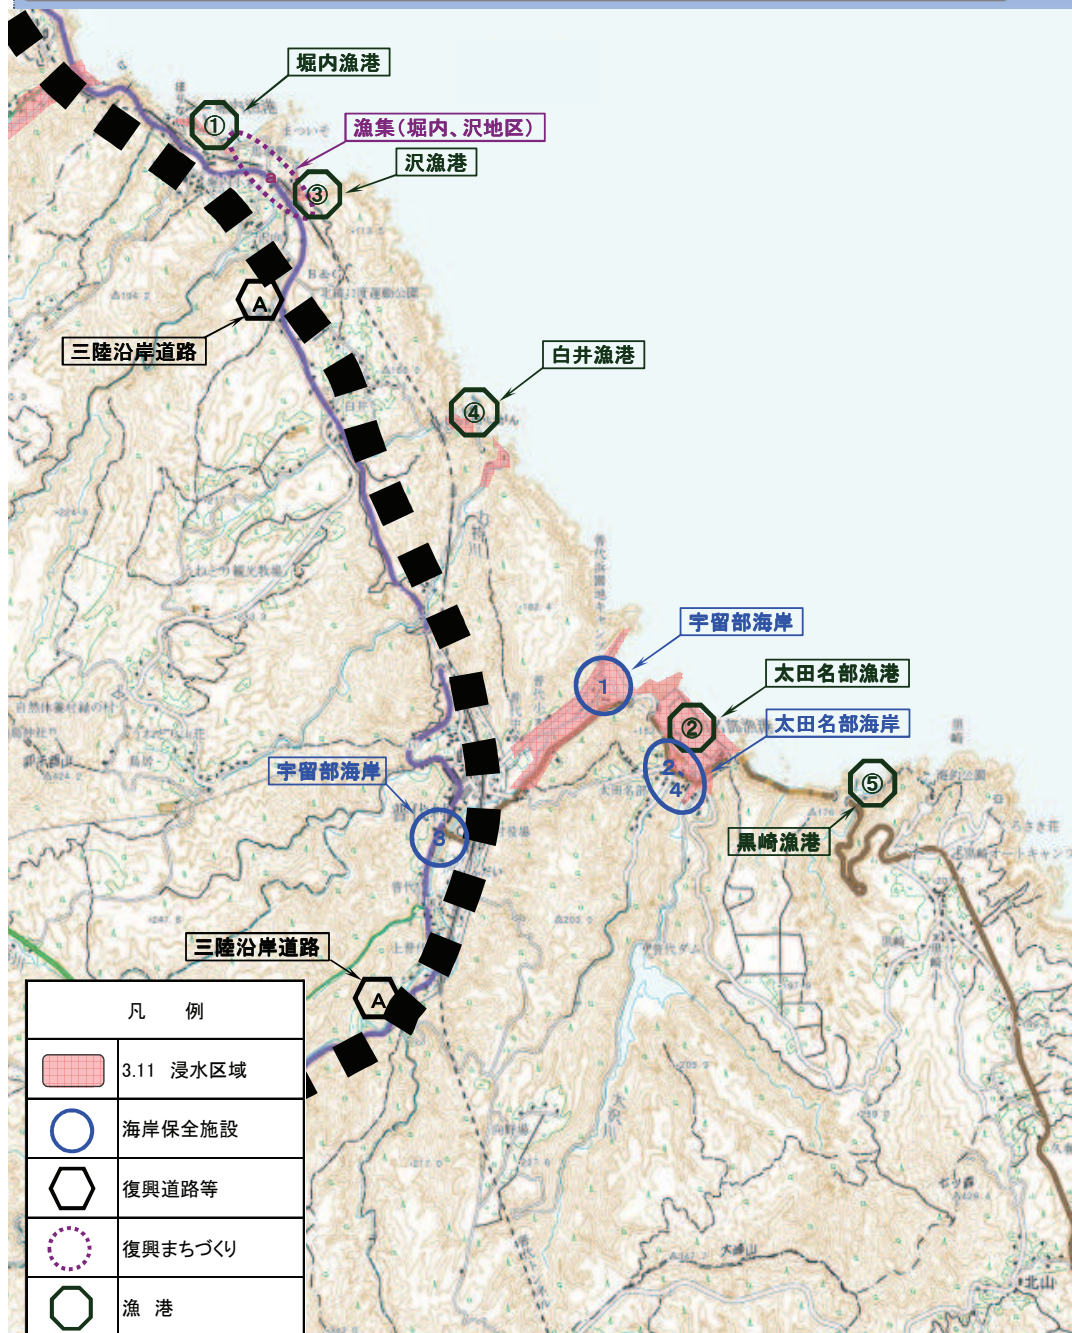

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連続期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇留部海岸	(災害復旧) 水門設備1式 他	施工準備	★工事								
			2 太田名部海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km 他	施工準備	☆工事	■H24.10完了							
			3 宇留部海岸	(県単治水事業) 陸間N=1基	施工準備	★工事								
			4 太田名部海岸	(海岸危機) 陸間等遠隔操作化 N=2基	施工準備	工事								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	普代～久慈	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始) ◆H25.6.27起工式								
				普代バイパス	(事業中)	★用地・工事の推進								
				尾肝要～普代	(H23新規) 事業準備	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)								
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 堀内、沢地区	避難路	事業準備	設計等	工事							
漁 港	漁 港	県	① 堀内漁港	(漁港災害) 防波堤N=1式 他	施工準備	★工事								
			② 太田名部漁港	(漁港災害) 防波堤L=285m、岸壁L=36m 他	施工準備	★工事								
		村	③ 沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=77m 他	施工準備	☆工事	■H25.7完了							
			④ 白井漁港	(漁港災害) 防波堤L=89m、岸壁L=7m 他	施工準備	☆工事	■H24.6完了							
			⑤ 黒崎漁港	(漁港災害) 泊地N=1式	施工準備	☆工事	■H23.9完了							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。


社会資本の復旧・復興ロードマップ

【田野畑村】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】岩泉土木センター (0194-22-3116)
宮古水産振興センター(0193-64-2216)
【村】田野畑村建設第二課 (0194-34-2111)

心をひとつに 未来に向けた復興

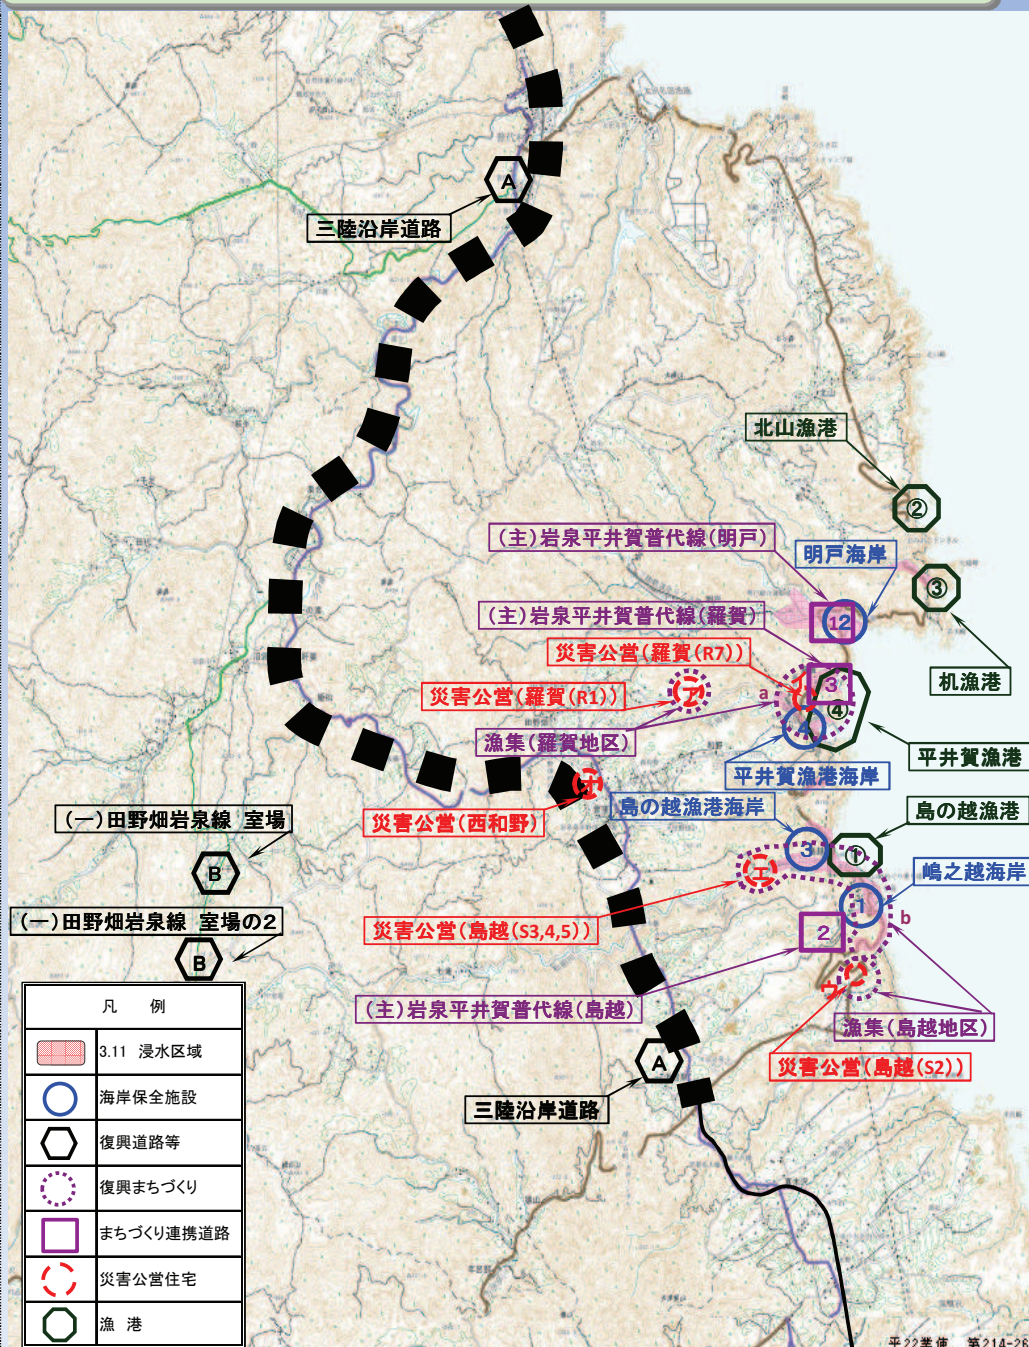

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、水門等N=2基	★工事 (防潮堤・水門)	(田野畑村 防災セクター工事)			工事 (遠隔設備)					
			2 明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	施工準備	工事								
	漁港海岸	村	3 島の越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=1基 他	施工準備	工事								
			4 平井賀漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=1基 他	施工準備	工事								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	尾肝要～普代	(H23新規) 事業準備	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)								
				尾肝要道路	(事業中)	★用地・工事の推進								
	復興関連道路	県	B (一) 田野畑岩泉線	室場	★工事の推進	■H24.3.27供用開始								
				室場の2	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 羅賀地区	集落道、用地造成他 対象戸数：50戸 (民25戸・公25戸)	事業準備	設計、用地等	民25戸 公25戸	★宅地造成工事	集落道工事等					
			b 島越地区	集落道、用地造成他 対象戸数：73戸 (民38戸・公35戸)	事業準備	設計、用地等	民38戸 公35戸	★宅地造成工事	集落道工事等					
	まちづくり連携道路	県	1 (主)岩泉平井賀普代線	明戸		施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
			2 (主)岩泉平井賀普代線	島越		施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
			3 (主)岩泉平井賀普代線	羅賀		施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
	災害公営住宅	村	A 羅賀R1地区 (漁：羅賀地区)	木造 予定戸数：18戸		用地・造成	設計 工事	18戸						
			I 羅賀R7地区 (漁：羅賀地区)	木造 予定戸数：7戸		用地・造成	設計 工事	7戸						
			ウ 島越S2地区 (漁：島越地区)	木造 予定戸数：25戸		用地・造成	設計 工事	25戸						
漁 港	買収	村	E 島越S3.4.5地区 (漁：島越地区)	木造 予定戸数：10戸		用地・造成	設計 ★工事	10戸						
			オ 西和野地区 (単独)	木造 予定戸数：8戸		用地	設計 工事	8戸						
	漁 港	県	① 島の越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,002m、岸壁L=561m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			② 北山漁港	(漁港災害) 臨港道路L=155m	施工準備	応急対策	★工事	■H25.3完了						
	村	村	③ 机漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、岸壁L=101m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			④ 平井賀漁港	(漁港災害) 防波堤L=666m、岸壁L=193m 他	施工準備	応急対策	★工事							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

社会資本の復旧・復興ロードマップ

【岩泉町】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)


心はひとつ いのちの海に 未来を拓く岩泉

問い合わせ先

【県】岩泉土木センター(0194-22-3116)、

宮古水産振興センター(0193-64-2216)

【町】岩泉町地域整備課、教育委員会事務局(0194-22-2111)

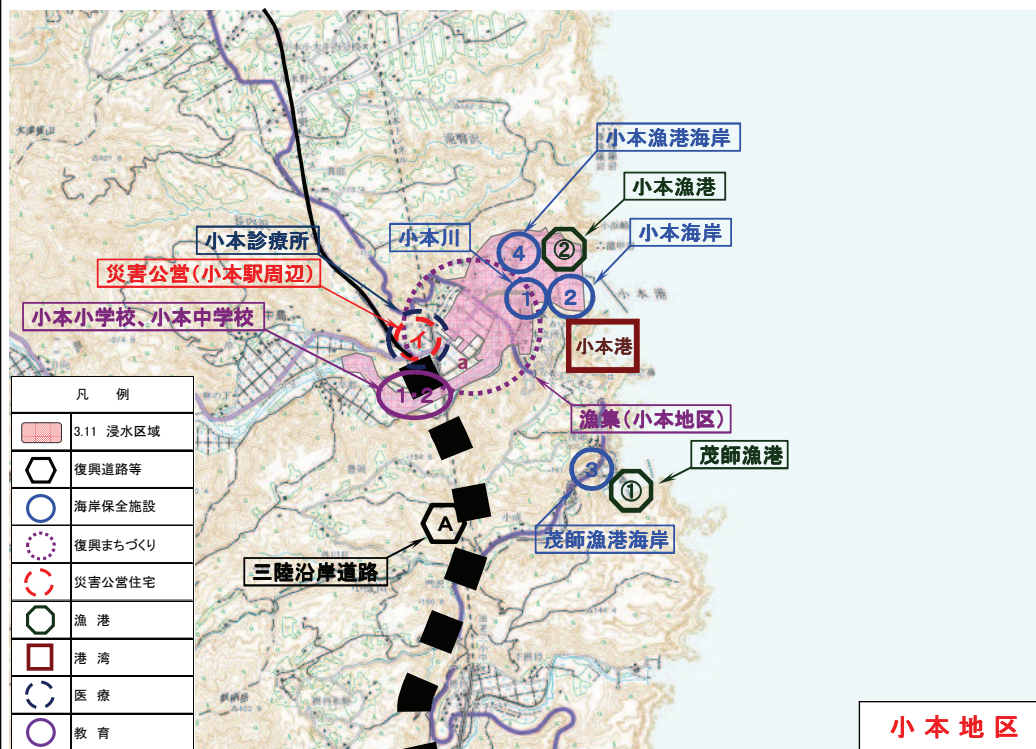

小本地区



岩泉地区



安家地区

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基礎復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連携期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.2km	施工準備		★工事							
			2 小本海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km	施工準備	☆工事	■H25.3完了							
	漁港海岸	町	3 茂師漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基 他	施工準備		★工事							
			4 小本漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備	☆工事	■H25.3完了						
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老～岩泉	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始) ■H25.3.27起工式								
	復興支援道路	県	B (主) 久慈岩泉線	龍泉洞	☆用地・工事の推進 (逐次供用開始)		■H24.8.28供用開始							
			大月峠		(H24新規) 施工準備	用地買収	用地・工事の推進 (逐次供用開始)							
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 小本地区	集落道、用地造成他 対象戸数: 60戸 (民60戸)	事業準備	設計・用地等	★工事							
災害公営住宅	直接建設	町	A 森の越 (単独)	木造 予定戸数: 15戸		設計	☆工事	■H25.7完了						
			I 小本駅周辺 (単独)	木造 予定戸数: 20戸 RC造 予定戸数: 16戸		用地・造成	設計	★工事						
漁港	漁港	県	① 茂師漁港	(漁港災害) 防波堤L=493m、岸壁L=280m 他	施工準備		★工事							
			② 小本漁港	(漁港災害) 防波堤L=103m、岸壁L=844m 他	施工準備		★工事							
港湾	小本港	県	小本浜地区	(港湾災害復旧) 防波堤L=871m、岸壁L=119m、物揚場L=105m他	施工準備		★工事							
医療	医科診療所	町	小本診療所	診療所施設整備		設計	工事							
教育	小学校	町	1 小本小学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意	用地取得・設計	造成工事	移転完了まで仮設校舎を使用						
	中学校	町	2 小本中学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意	用地取得・設計	造成工事	移転完了まで仮設校舎を使用						


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市 1/4】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】宮古土木センター(0193-64-2221)、宮古水産振興センター(2216)、宮古農林振興センター(2214)、同 林務室(2215)【市】宮古市水産課(0193-62-2111)

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

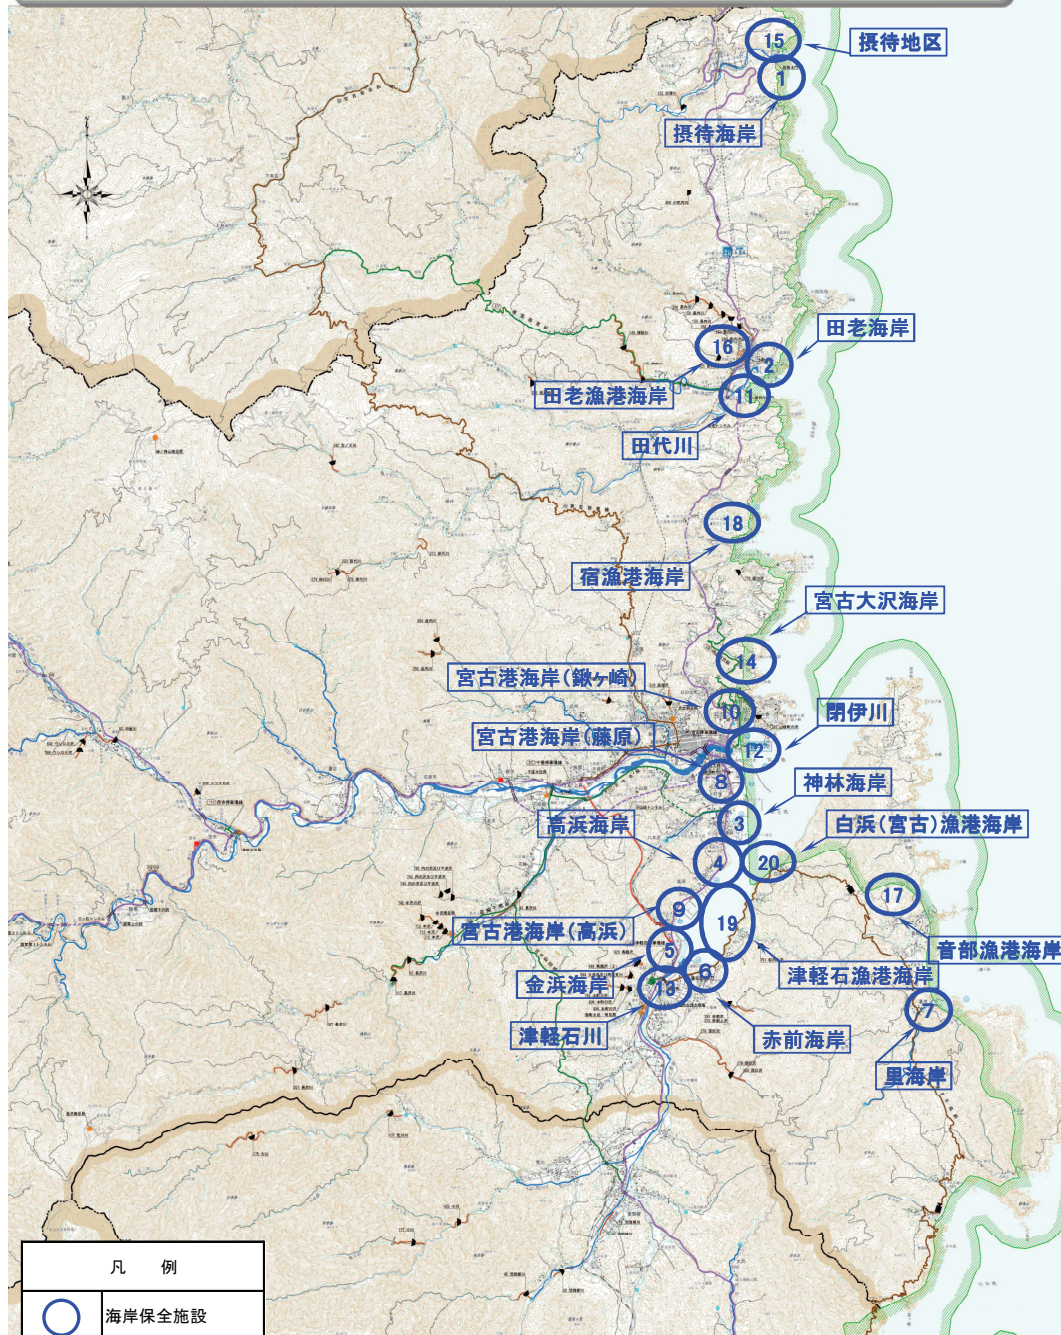

分区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 摂待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	施工準備			工事								
			2 田老海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門等N=4基 (海岸危機) 水門等遠隔操作化N=4基	施工準備		★工事			工事						
			3 神林海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門等N=7基 (海岸危機) 陸間等遠隔操作化N=4基	施工準備		★工事			工事						
			4 高浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 陸間等N=4基 (港湾高潮) 防潮堤L=0.9km (海岸危機) 陸間等遠隔操作化N=4基	施工準備		★工事			工事						
			5 金浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 陸間等N=5基 (海岸危機) 陸間等遠隔操作化N=3基	施工準備		★工事			工事						
			6 赤前海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 樋門N=1基	施工準備		★工事			工事						
			7 里海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 樋門N=1基	施工準備		★工事			工事						
			8 宮古港海岸 (藤原)	(港湾高潮・災害) 防潮堤L=2.2km、 陸間N=4基	施工準備		★工事			工事						
			9 宮古港海岸 (高浜)	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 陸間N=1基	施工準備		★工事			工事						
			10 宮古港海岸 (鎌ヶ崎)	(港湾高潮) 防潮堤L=0.7km	施工準備			★工事			工事					
			11 田代川	(災害復旧) 水門N=1基	施工準備		★工事			工事						
			12 閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	施工準備			★工事			工事					
			13 津軽石川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.9km	施工準備			★工事			工事					
	農地海岸	林野海岸	14 宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.1km 水門等N=3基	施工準備		★工事			工事						
			15 摂待地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=0.3km	施工準備		★工事			工事						
	漁港海岸	市	16 田老漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門N=4基 他	施工準備		★工事			工事						
			17 音部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基 他	施工準備		★工事			工事						
			18 宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	施工準備		★工事			工事						
			19 津軽石 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=1基 他	施工準備		★工事			工事						
			20 白浜(宮古) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	施工準備		★工事			工事						

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老～岩泉	(H23新規) 事業準備		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.3.27起工式			(逐次供用開始)				
				宮古中央～田老	(H23新規) 事業準備		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H24.11.18「即年着工」起工式			(逐次供用開始)				
				宮古道路 (宮古中央インター～線)	(事業中)	★用地・工事の推進	◆H25.3.23「宮古中央インター線」供用開始							
			B 宮古盛岡横断道路	山田～宮古南	(H23新規) 事業準備		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.17起工式			(逐次供用開始)				
				宮古～箱石	(H23新規) 事業準備		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			(逐次供用開始)				
				平津戸・岩井～松草	(H23新規) 事業準備		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			(逐次供用開始)				
	復興支援道路	県	C 国道340号	区界～築川	(H23新規) 事業準備		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			(逐次供用開始)				
				宮古西道路	(事業中)	★用地・工事の推進	(逐次供用開始)							
				小国	(事業中)	★用地・工事の推進	(逐次供用開始)							
				和井内道路	(事業中)	★用地・工事の推進	(逐次供用開始)							
復興まちづくり	復興関連道路	市	D (主) 重茂半島線	白浜～堀内	(事業中)	★用地・工事の推進	(逐次供用開始)							
				E 宮古市道北部環状線	(事業中)	★工事の推進								
				山口	(事業中)	★工事の推進								
				山口	(事業中)	★工事の推進								
	漁業集落防災機能強化	市	津波復興拠点	a 田老地区	区域面積：19.0ha 対象戸数：85戸 (民45戸・公40戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	造成工事	順次住宅建設					調整中 民45戸
				b 野原地区	区域面積：15.8ha	事業準備・住民合意	都市計画決定等	造成工事	順次産業系の土地利用					
				c 鉄ヶ崎・光岸地区	区域面積：23.8ha 対象戸数：163戸 (民123戸・公40戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	造成工事	順次住宅建設					調整中 民123戸
				d 田老地区	対象戸数：285戸 (民203戸・公82戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★移転先造成工事	順次住宅建設					
				e 崎山地区	対象戸数：約30戸 (民6戸・公24戸)	事業準備・住民合意	事業計画、★工事	順次住宅建設						
				f 高浜・金浜地区	対象戸数：63戸 (民47戸・公16戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	移転先造成工事	順次住宅建設					
				g 法之脇地区 (津軽石)	対象戸数：12戸 (民12戸)	事業準備	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				h 赤前地区	対象戸数：56戸 (民56戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	移転先造成工事	順次住宅建設					
			漁業集落	i 拠点(中心市街地地区)	区域面積：検討中	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				j 拠点(中心市街地地区)	区域面積：検討中	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				k 拠点(中心市街地地区)	区域面積：検討中	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				l 拠点(中心市街地地区)	区域面積：検討中	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				m 拠点(中心市街地地区)	区域面積：検討中	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				n 拠点(中心市街地地区)	区域面積：検討中	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				o 拠点(中心市街地地区)	区域面積：検討中	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					
				p 拠点(中心市街地地区)	区域面積：検討中	事業準備・住民合意	事業計画策定、設計、用地取得	★工事	順次住宅建設					


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 【宮古市 3/4】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】宮古土木センター (0193-64-2221)
【市】建築住宅課、保健福祉部健康課 (0193-62-2111)、
(教)総務課 (0193-68-9115)

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

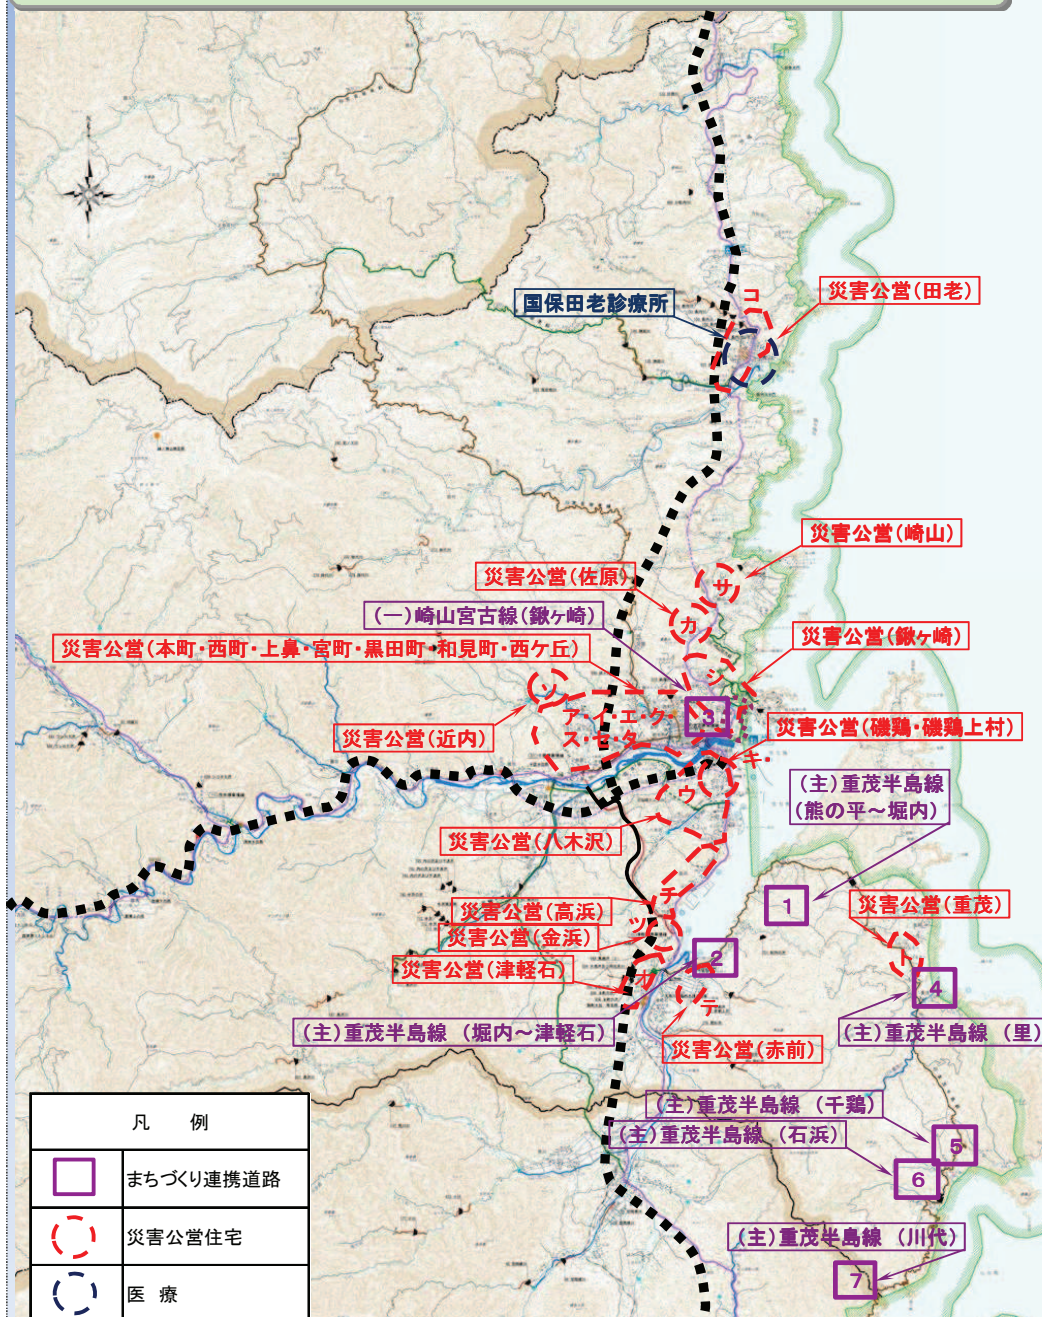

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)		第2期(本格復興期間)				第3期(更なる復興への基盤期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちなみづくり	県	まちなみづくり連携道路	1 (主)重茂半島線	熊の平～堀内		用地買収	用地買収	用地・工事の推進						
			2 (主)重茂半島線	堀内～津軽石		用地買収	用地買収	用地・工事の推進						
			3 (一)崎山宮古線	鍛ヶ崎		用地買収	用地買収	用地・工事の推進						
			4 (主)重茂半島線	里		用地買収	用地買収	用地・工事の推進						
			5 (主)重茂半島線	千鶴		用地買収	用地買収	用地・工事の推進						
			6 (主)重茂半島線	石浜		用地買収	用地買収	用地・工事の推進						
			7 (主)重茂半島線	川代		用地買収	用地買収	用地・工事の推進						
災害公営住宅	直接建設	県	ア 本町(単独)	RC造8階 予定戸数:33戸		用地	設計	工事	33戸					
			イ 西町(単独)	RC造4階 予定戸数:20戸		用地	設計	工事	20戸					
	設計・施工一括選定	県	ウ 八木沢(単独)	RC造5階 予定戸数:50戸		用地	設計・工事	50戸						
			エ 上鼻(単独)	RC造5階 予定戸数:30戸		用地	設計・工事	30戸						
	敷地提案型買収	県	オ 津軽石(単独)	RC造5階 予定戸数:35戸		用地	設計・工事	35戸						
			カ 佐原(単独)	RC造 予定戸数:50戸		用地・造成	設計	工事	50戸					
			キ 磯鶏(単独)	S造 予定戸数:30戸		用地・造成	設計	工事	30戸					
			ク 宮町(単独)	S造 予定戸数:20戸		用地・造成	設計	工事	20戸					
			その他地区(単独)	予定戸数:79戸		用地・設計・工事	79戸							
			ケ 磯鶏上村(単独)	予定戸数:24戸		用地	設計・工事	24戸						
	設計・施工一括選定	市	コ-1 田老(防:田老地区)	RC造 予定戸数:82戸		用地・造成	設計	工事	82戸					
			コ-2 田老(高台)(防:田老地区)	予定戸数:40戸		用地	設計	工事	40戸					
			サ 崎山(防:崎山地区)	予定戸数:24戸		用地	設計	工事	24戸					
			シ-1 鍛ヶ崎(単独)	予定戸数:26戸		用地・造成	設計	工事	26戸					
			シ-2 鍛ヶ崎(区:鍛ヶ崎地区)	予定戸数:40戸		用地・設計・工事	40戸							
			ス 黒田町(単独)	予定戸数:24戸		用地	設計	工事	24戸					
			セ 和見町(単独)	予定戸数:26戸		用地	設計	工事	26戸					
			ソ-1 近内(単独)	RC造 予定戸数:40戸		用地	設計	工事	40戸					
			ソ-2 近内(単独)	RC造 予定戸数:40戸		用地	設計	工事	40戸					
			タ 西ヶ丘(単独)	予定戸数:24戸		用地	設計	工事	24戸					
			チ 高浜(単独)	予定戸数:12戸		用地	設計	工事	12戸					
			ツ 金浜(防:金浜地区)	予定戸数:16戸		用地	設計	工事	16戸					
医療	市	国保田老診療所	テ 赤前(単独)	予定戸数:18戸		用地	設計	工事	18戸					
			ト 重茂(防:重茂地区)	予定戸数:5戸		用地	設計	工事	5戸					
			その他地区(単独)	予定戸数:5戸		用地・設計・工事	5戸							
			国保田老診療所	診療所施設整備				用地・設計・工事						
			1 輪磯小学校	学校統合(予定)		住民合意	統合準備	H26 重茂小学校に統合予定 統合までの期間、重茂小学校を使用						
			2 千鶴小学校	学校統合(予定)		住民合意	統合準備	H26 重茂小学校に統合予定 統合までの期間、重茂小学校を使用						


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市 4/4】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】宮古土木センター(0193-64-2221)
宮古水産振興センター(0193-64-2216)
【市】宮古市水産課(0193-62-2111)

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

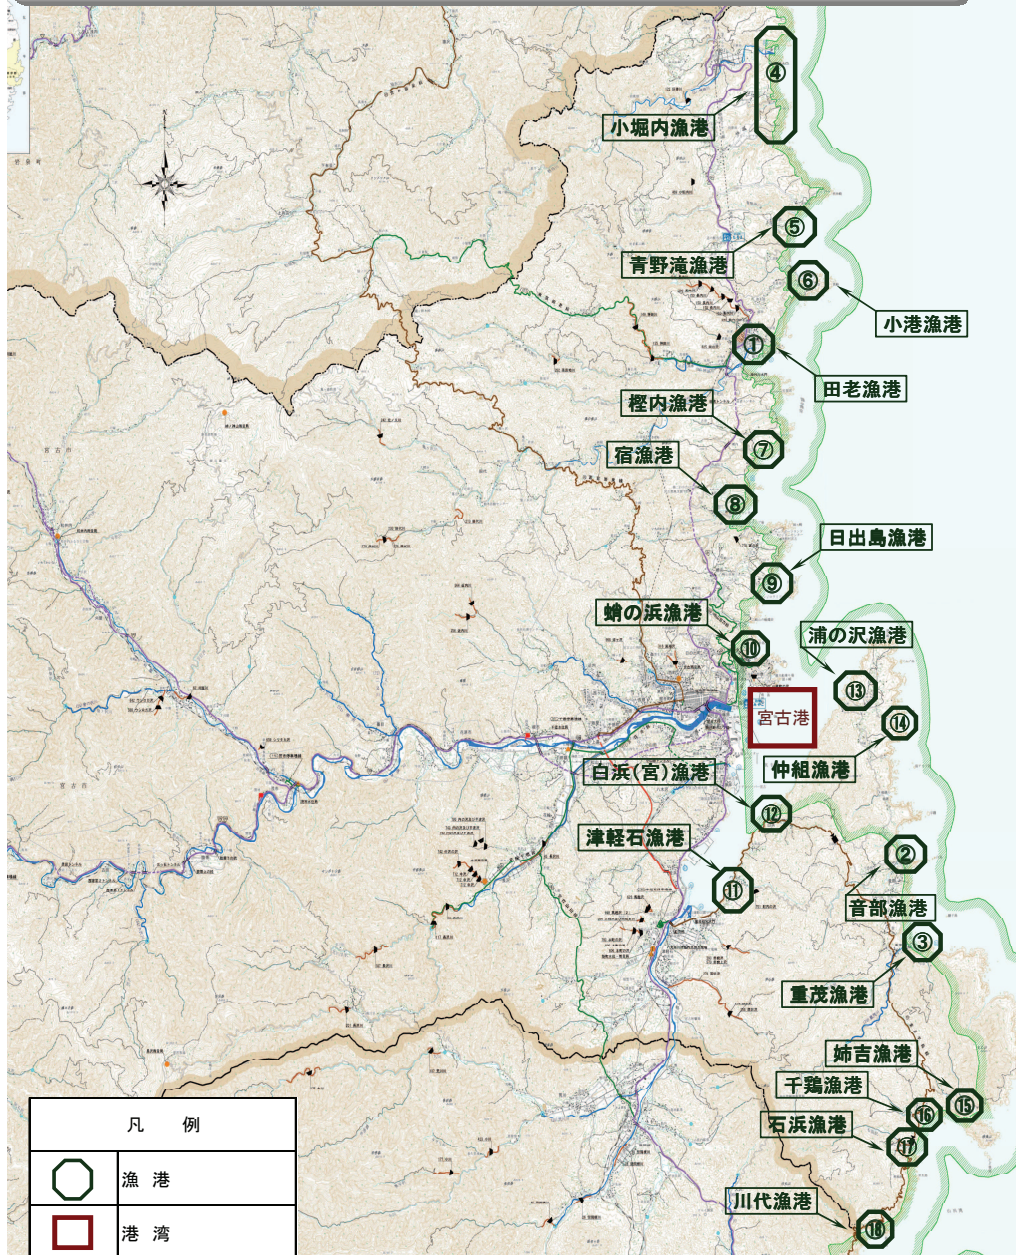

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)		第2期(本格復興期間)			第3期(更なる発展への基盤整備)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
漁港	漁港	県	① 田老漁港	(漁港災害) 防波堤L=689m、岸壁L=1,133m 他	施工準備	★工事								
			② 音部漁港	(漁港災害) 防波堤L=352m、岸壁L=206m 他	施工準備	★工事								
			③ 重茂漁港	(漁港災害) 防波堤L=373m、岸壁L=663m 他	施工準備	★工事								
		市	④ 小堀内漁港	(漁港災害) 防波堤L=121m、岸壁L=127m 他	施工準備	★工事								
			⑤ 青野漁港	(漁港災害) 防波堤L=46m 他	施工準備	★工事								
			⑥ 小港漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m 他	施工準備	★工事								
			⑦ 堀内漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、岸壁L=52m 他	施工準備	★工事								
			⑧ 宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m、岸壁L=215m 他	施工準備	★工事								
			⑨ 日出島漁港	(漁港災害) 防波堤L=526m、岸壁L=320m 他	施工準備	★工事								
			⑩ 蛸の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=260m 他	施工準備	★工事								
			⑪ 津軽石漁港	(漁港災害) 防波堤L=196m、岸壁L=50m 他	施工準備	★工事								
			⑫ 白浜(宮)漁港	(漁港災害) 防波堤L=110m、岸壁L=200m 他	施工準備	★工事								
			⑬ 浦の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m、岸壁L=101m 他	施工準備			工事						
			⑭ 仲組漁港	(漁港災害) 防波堤L=157m、岸壁L=145m 他	施工準備	★工事								
			⑮ 姉吉漁港	(漁港災害) 防波堤L=86m、岸壁L=40m 他	施工準備	★工事								
			⑯ 千鷲漁港	(漁港災害) 防波堤L=428m、岸壁L=260m 他	施工準備	★工事								
			⑰ 石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=345m、岸壁L=100m 他	施工準備	★工事								
			⑱ 川代漁港	(漁港災害) 防波堤L=73m、岸壁L=45m 他	施工準備	★工事								
港湾	宮古港	国	竜崎防波堤	(防波堤整備・直轄災害復旧) 防波堤L=400m	★工事(平成29年度完成予定)									
		県	出崎地区	(災害復旧) 出崎防波堤(2)L=20m	暫定供用	★防波堤			臨港道路	臨港道路の一部				
			鎌ヶ崎地区	(災害復旧) 防波堤L=295m、3.0m物揚場L=728m	暫定供用				物揚場	物揚場の一部				
			日立浜地区	(災害復旧) 4.5m岸壁L=240m、2.0m物揚場L=101m、船揚場(1)L=228m、船揚場(2)L=84m	暫定供用	★船揚場、★岸壁			物揚場、船揚場、臨港道路					
			高浜地区	(災害復旧) 防波堤(北)L=250.2m、防波堤(南)L=200m、2.0m物揚場(1)、(2)L=200m他	暫定供用	★防波堤、★物揚場、★船揚場			臨港道路					
			藤原地区	(災害復旧) 船揚場L=50m、埠頭保安設備L=1,250m	暫定供用	★公共上屋			★心臓保安設備、★臨港道路			船揚場		
			神林地区	(災害復旧) 南防波堤L=112m、防波堤L=31m、2.0m物揚場L=181m 他	暫定供用	★防波堤、★船揚場、★浮桟橋、物揚場			臨港道路	船揚場				
			浄土ヶ浜地区	(災害復旧) 防波堤L=89m、2.0m物揚場L=44m、2.0mL=70m	暫定供用	★防波堤、★臨港道路、★物揚場					■H25.7完了			


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町 1/3】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】宮古土木センター(0193-64-2221)、
宮古農林振興センター(-2214)、同 林務室(-2215)、
宮古水産振興センター(-2216)、医療局(019-629-6347)
【町】山田町復興推進課 (0193-82-3111)

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、
碧い海とともに暮らす町

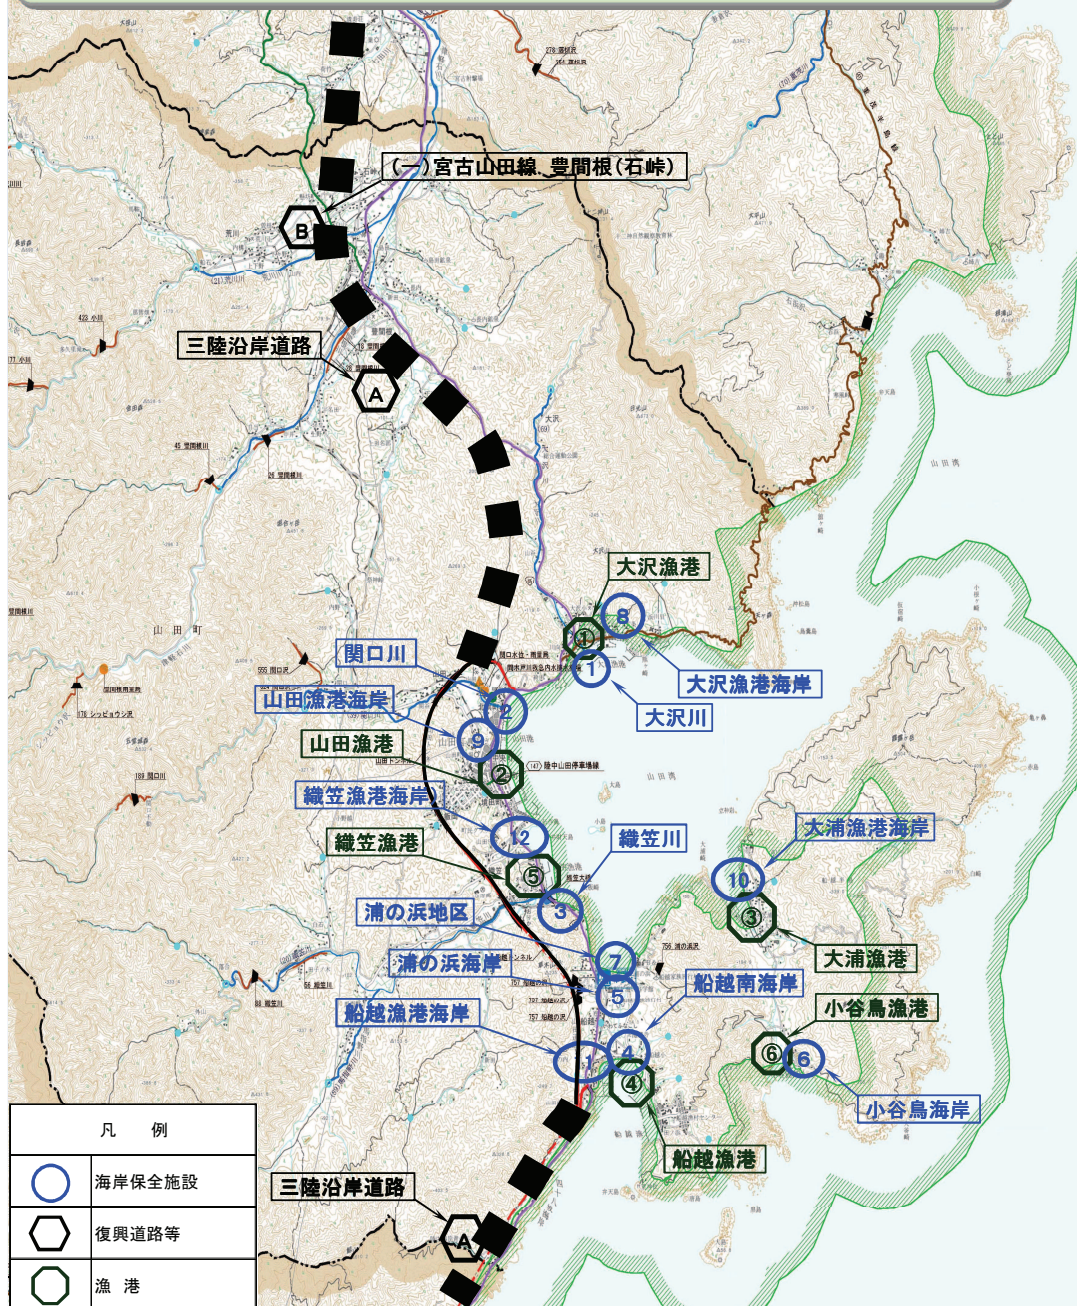

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる発展への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備			工事						
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備			工事						
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備			★工事						
			4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	応急対策	施工準備		★工事						
	農地海岸	県	5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	施工準備			★工事						
			6 小谷島海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	施工準備			★工事						
	林野海岸	町	7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	施工準備	★工事	■H25.3完了							
	漁港海岸	町	8 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=9基 他	応急対策	施工準備		工事						
			9 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備		★工事						
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=6基 他		施工準備		★工事						
			11 船越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=6基 他		施工準備		工事						
			12 織笠漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備		工事						
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	山田～宮古南	(H23 事業新規) 準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始) ◆H25.6.17起工式								
	復興支援道路	県	B (一) 豊間根				(H25 新規) 施工準備	用地買収	用地・工事の推進					
	復興関連道路	町	石峠		用地・工事の推進 (逐次供用開始)				復興支援道路「(一)宮古山田線 豊間根」に移行					
漁 港	県	町	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他	施工準備			★工事						
			② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他	施工準備			★工事						
			③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他	施工準備			★工事						
			④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他	施工準備			★工事						
	町	町	⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他	施工準備			★工事						
			⑥ 小谷島漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他	施工準備			★工事						

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。


社会資本の復旧・復興ロードマップ

【山田町 2 / 3】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】宮古土木センター(0193-64-2221)
水産振興センター(0193-64-2216)、医療局(019-629-6347)
【町】山田町復興推進課(0193-82-3111)
(教)学校教育課(0193-82-3111内312)


みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、
碧い海とともに暮らす町

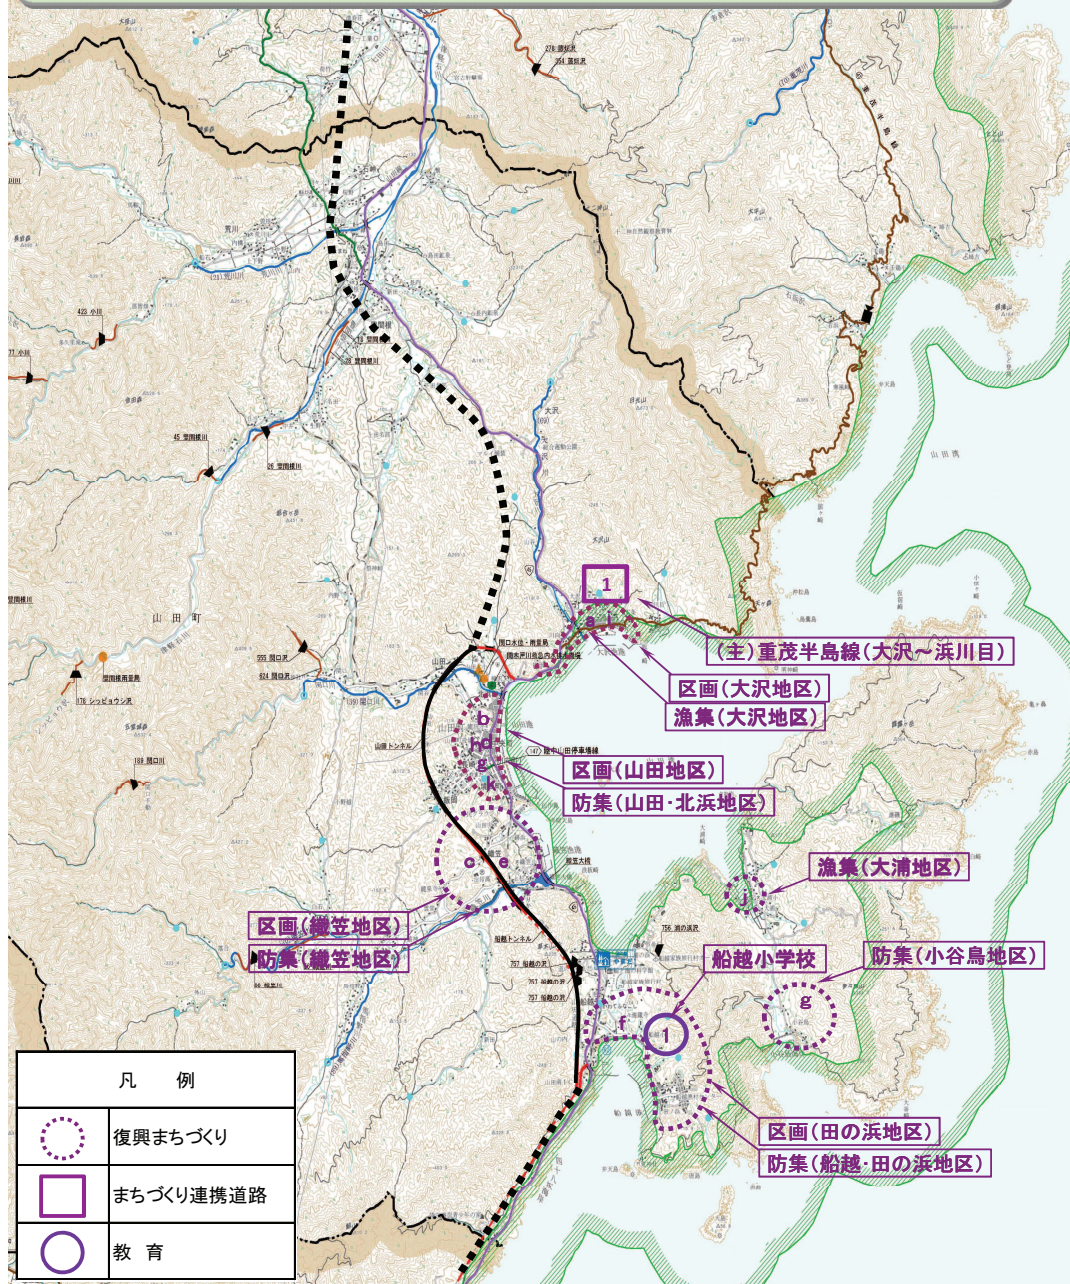

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(新たな産業への過渡期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興まちづくり	土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積:6.5ha 対象戸数:110戸 (民90戸・公20戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	工事			順次住宅建設			調整中 民90戸	
			b 山田地区	区域面積:20.5ha 対象戸数:345戸 (民205戸・公140戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	工事(県街路含む)			順次住宅建設			調整中 民205戸	
			c 織笠地区	区域面積:2.5ha 対象戸数:27戸 (民27戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	★工事			順次住宅建設			調整中 民27戸	
			危険区域 (山田15.0ha、織笠14.0ha、田の浜4.5ha)		事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	工事							
	防災集団移転	町	d 山田・北浜地区	対象戸数:413戸 (民228戸・公185戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事			順次住宅建設			
			e 織笠地区	対象戸数:193戸 (民171戸・公22戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事			順次住宅建設			
			f 船越・田の浜地区	対象戸数:222戸 (民158戸・公64戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事			順次住宅建設			
			g 小谷島地区	対象戸数:4戸 (民4戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事			順次住宅建設			
	津波復興拠点	町	h-1 山田地区 (中心市街地エリア)	区域面積:2.3ha	事業準備・住民合意	調査・設計等	用地	工事						
			h-2 山田地区 (公共防災エリア)	区域面積:2.7ha	事業準備・住民合意	調査・設計等	用地	工事						
	漁業集落防災機能強化	町	i 大沢地区	集落道、用地造成他 対象戸数:177戸 (民144戸・公33戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事			順次住宅建設			
			j 大浦地区	集落道、用地造成他 対象戸数:29戸 (民8戸・公21戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事			順次住宅建設			
まちづくり連携道路	街路整備	県	k 陸中山田 停車場線	整備延長:200m							設計・工事等 土地区画整理山田地区に移行			
	まちづくり連携道路	町	1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目							用地買収	用地・工事の推進		
医療	病院	県	県立山田病院	織笠地区山田中学校北側町有地		建設場所選定					用地・設計・工事		1病棟一般病床50床 程度、診療科は内科・外科を基本にこれまでの外来診療機能を維持 他	
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧)移転	住民合意等	用地取得・設計	★造成工事				移転完了まで県立陸中海岸青少年の家を使用			

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、
碧い海とともに暮らす町

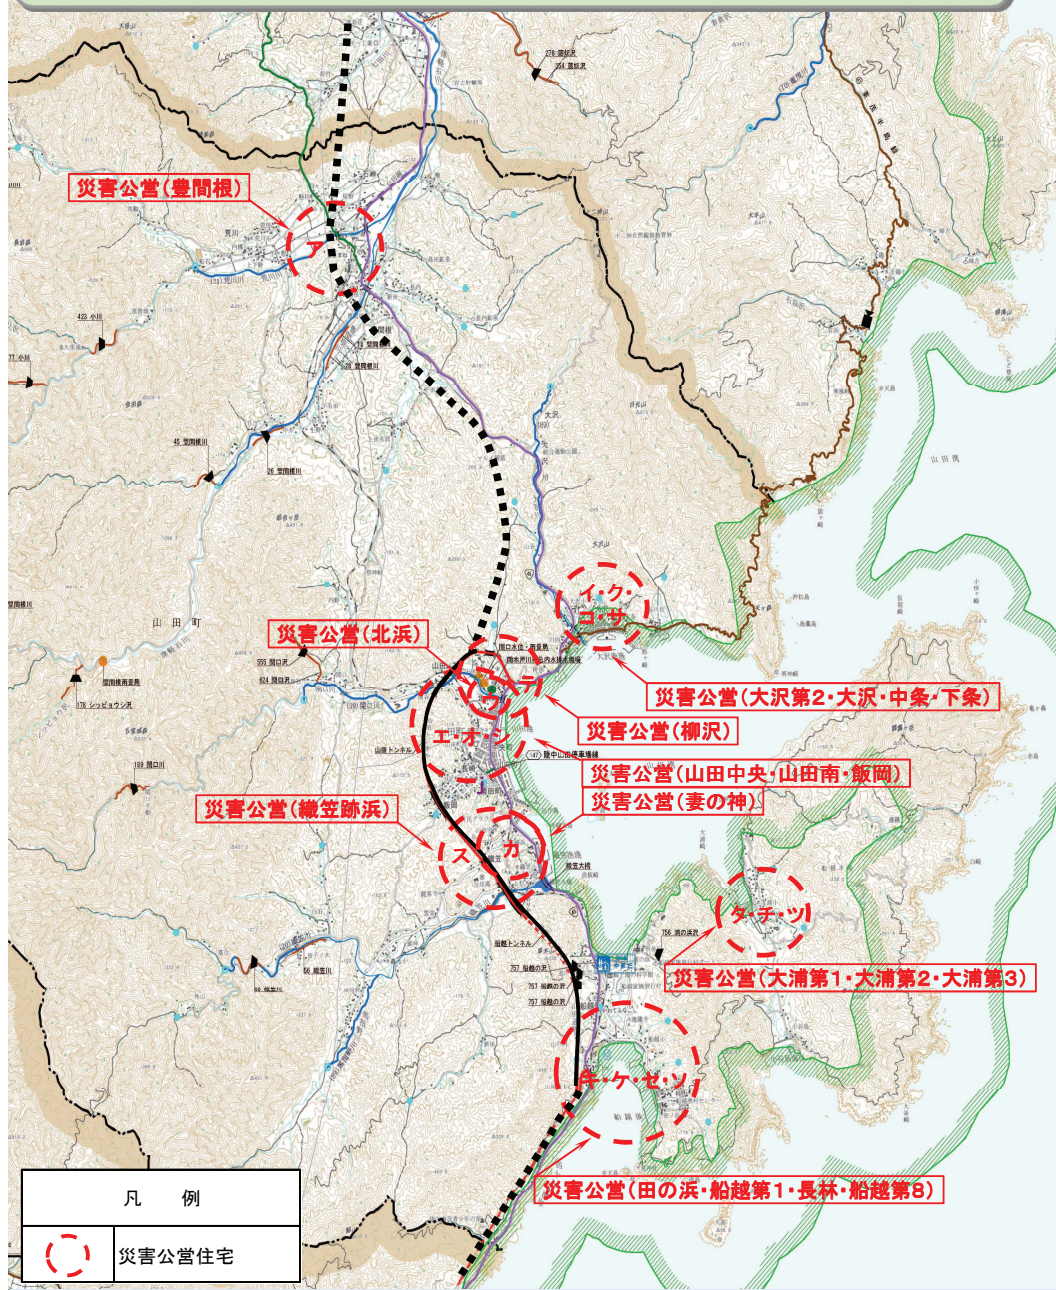


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる発展への連続期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
災害公営住宅	直接建設	県	ア 豊間根(単独)	S造3階 予定戸数:72戸		用地	設計	★工事							
			イ 大沢第2(区:大沢地区)	RC造 予定戸数:20戸				用地・設計・工事		20戸					
			ウ 北浜(単独)	RC造5階 予定戸数:90戸		用地	設計		工事	90戸					
			エ 山田中央(区:山田地区)	RC造 予定戸数:140戸				用地・設計・工事		140戸					
			オ 山田南(防:山田地区)	RC造 予定戸数:70戸				用地・設計・工事		70戸					
			カ 妻の神(単独)	RC造 予定戸数:70戸		用地	設計		工事	70戸					
			キ 田の浜(単独)	予定戸数:20戸				用地・設計・工事		20戸					
			設計・施工一括選定		ク 大沢(単独)	RC造5階 予定戸数:35戸		用地		設計・工事		35戸			
					ケ 船越第1(防:船越地区)	予定戸数:30戸				用地・設計・工事		30戸			
	直接建設	町	コ 中条(漁:大沢地区)	予定戸数:17戸			用地		設計	工事	17戸				
			サ 下条(漁:大沢地区)	予定戸数:16戸			用地		設計	工事	16戸				
			シ 飯岡(防:山田地区)	予定戸数:115戸			用地			設計	工事	115戸			
			ス 織笠跡浜(防:織笠地区)	予定戸数:22戸			用地		設計	工事	22戸				
			セ 長林(防:船越・田の浜地区)	予定戸数:21戸			用地		設計	工事	21戸				
			ソ 船越第8(防:船越・田の浜地区)	予定戸数:13戸			用地		設計	工事	13戸				
			タ 大浦第1(単独)	予定戸数:10戸		用地	設計	工事	10戸						
			チ 大浦第2(漁:大浦地区)	予定戸数:10戸				用地		設計	工事	10戸			
			ツ 大浦第3(漁:大浦地区)	予定戸数:11戸				用地		設計	工事	11戸			
			テ 柳沢(単独)	予定戸数:49戸				設計	工事	49戸					

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

**基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)**

問い合わせ先

【県】沿岸広域振興局(0193-25-〔以下のとおり〕)土木部(2714)、
農林部(2704)、水産部(2706)、医療局(019-629-6347)
【町】大槌町都市整備課(0193-42-8723)、(教)学務課(0193-42-6100)

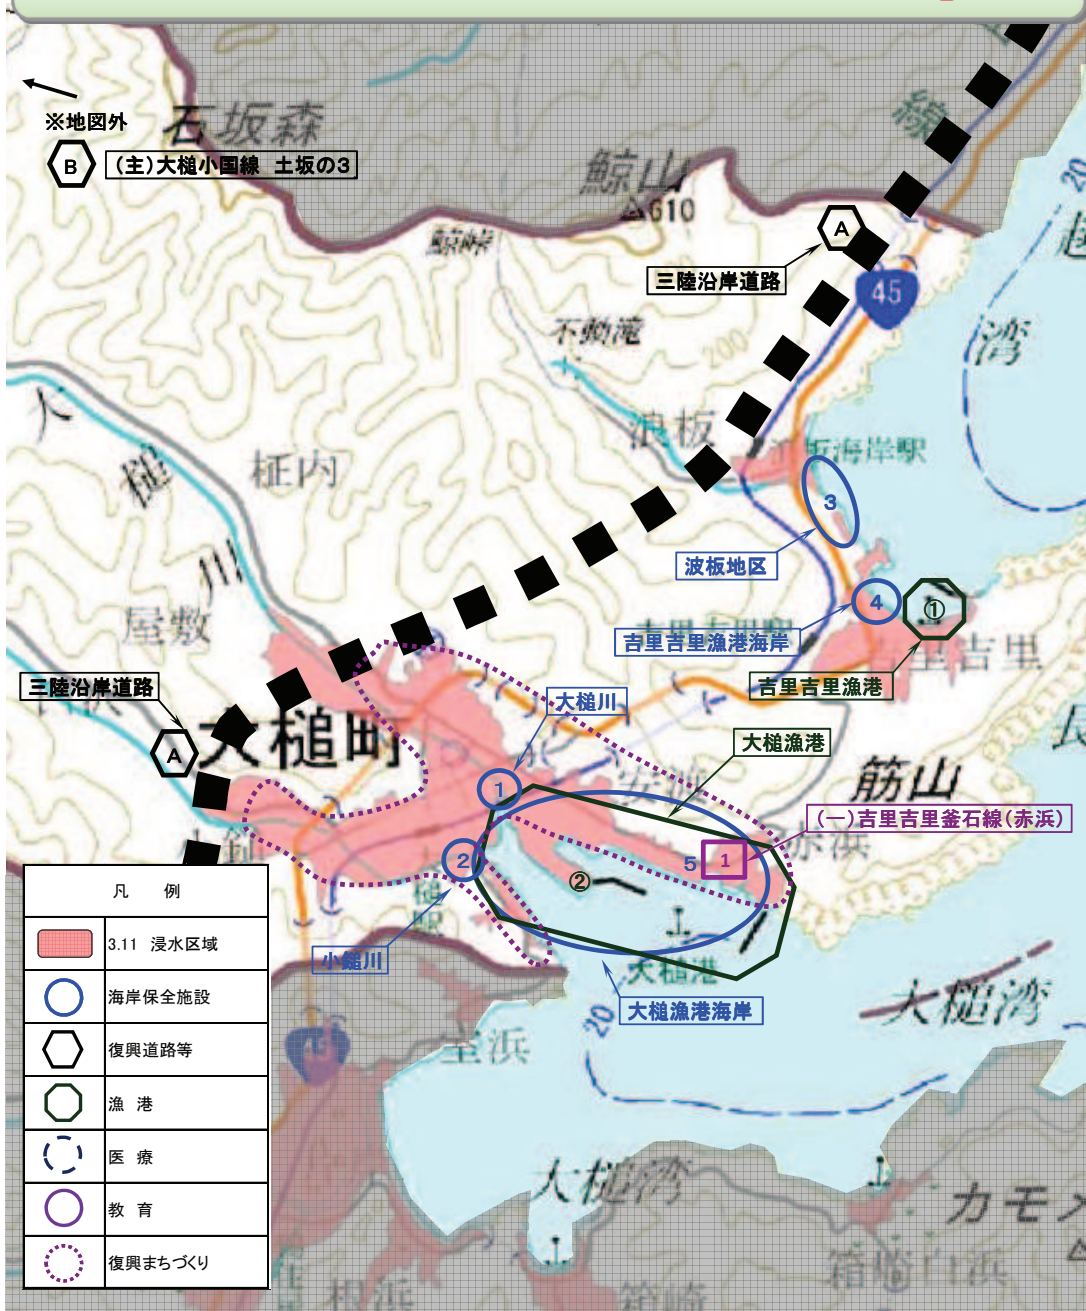

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)				第3期(変なる展開への過渡期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=3基	応急対策	施工準備		工事							
			2 小槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=2基		施工準備		工事(県街路含む)							
	林野海岸	県	3 浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	施工準備	☆工事	■H24.10完了								
			漁港海岸	4 吉里吉里 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=4基 他	応急対策	施工準備		工事						
				5 大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、 水門N=3基 他	応急対策	施工準備	★工事(県街路含む)							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	(事業中) ★用地・工事の推進 (逐次供用開始)										
	復興関連道路	県	B (主) 大槌小国線	土坂の3	(事業中) ★用地・工事の推進 (逐次供用開始)										
漁港	漁港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=753m 他	施工準備	応急対策		★工事							
			② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、 岸壁L=2,582m 他	施工準備	応急対策		★工事							
医療	病院	県	県立大槌病院	寺野地区ふれあい運動公園内	建設場所選定	用地・設計・工事							1病棟一般病床50床程度、診療科は内科・外科を基本にこれまでの外来診療機能を維持 他		
教育	小学校	町	大槌小学校 安達小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意	H25 小学校4校統合(新校名:大槌小学校) 移転場所について、協議・調整中であるため、大よその予定を掲載。 移転完了まで仮設校舎を使用。		用地取得・設計	造成工事						
	中学校		大槌中学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意	移転場所について、協議・調整中であるため、大よその予定を掲載。 移転完了まで仮設校舎を使用。		用地取得・設計	造成工事						
復興まちづくり	街路整備	県	4路線	整備延長:5,000m	設計・工事等 一般海岸小槌川、漁港海岸大槌漁港海岸、 土地区画整理町方、津波復興拠点町方・安達に移行										
	まちづくり連携道路		1 (一)吉里吉里 釜石線	赤浜	施工準備		用地買収	用地・工事の推進							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町 2／3】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先
【町】大槌町都市整備課 (0193-42-8723)

海の見えるつい散歩したくなる
こだわりのある「美しいまち」



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
土地区画整理	a 町方地区		区域面積:29.7ha 対象戸数:875戸 (民666戸・公209戸)	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等
	b 安渡地区		区域面積:6.0ha 対象戸数:170戸 (民170戸)	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等
	c 赤浜地区		区域面積:7.6ha 対象戸数:150戸 (民150戸)	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等
	d 吉里吉里地区		区域面積:9.1ha 対象戸数:283戸 (民263戸・公20戸)	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等	都市計画決定・事業計画策定・変更 関係地手続等
津波復興拠点	町方地区		区域面積	都市計画策定	事業準備・住民合意	都市計画策定	都市計画策定	都市計画策定	都市計画策定	都市計画策定	都市計画策定	都市計画策定	都市計画策定	都市計画策定
	町方地区(2.8ha)			調査・設計等	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	安渡地区(18.7ha)			用地・工事(未定)(東側含む)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
				事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
復興まちづくり	e-1 赤浜地区(赤浜①団地)		対象戸数:38戸 (民16戸・公22戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	e-2 赤浜地区(赤浜②団地)		対象戸数:43戸 (民43戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	f-1 吉里吉里地区(吉里吉里①団地)		対象戸数:21戸 (民21戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	f-2 吉里吉里地区(吉里吉里②団地)		対象戸数:39戸 (民39戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	f-3 吉里吉里地区(吉里吉里③団地)		対象戸数:16戸 (民16戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	g 浪板地区(浪板①団地)		対象戸数:19戸 (民19戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	h-1 安渡地区		対象戸数:86戸 (民9戸・公77戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	h-2 安渡地区(安渡①団地)		対象戸数:77戸 (民77戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	i-1 小枕・伸松地区(大ヶロ①団地)		対象戸数:3戸 (民3戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	i-2 小枕・伸松地区(小枕団地)		対象戸数:36戸 (民36戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	j-1 町方地区(寺野①団地)		対象戸数:183戸 (民153戸・公30戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	j-2 町方地区(町方団地)		対象戸数:75戸 (民75戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	j-3 町方地区(大ヶロ・沢山・夏本・榎内団地)		対象戸数:43戸 (民43戸)	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	k 吉里吉里地区		漁業集落排水施設、集落道他	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備
	l 浪板地区		漁業集落排水施設、用地造成、集落道他	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備
漁業集落防災機能強化	m 安渡地区(安渡①団地)		対象戸数:9戸 (民9戸)	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備
	n 赤浜地区		用地造成、集落道他 対象戸数:6戸 (民6戸)	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町 3／3】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先

【県】沿岸広域振興局 土木部 (0193-25-2714)
【町】大槌町用地建築課 (0193-42-8719)

海の見えるつい散歩したくなる
こだわりのある「美しいまち」




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(定住復興期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
直接建設	県	ア 吉里吉里(単独)	RC造5階 予定戸数:34戸	設計	★工事									
		イ 桧内(単独)	RC造 予定戸数:90戸	用地	設計									
		ウ 屋敷前(単独)	RC造5階 予定戸数:151戸	用地	設計	★工事								
		エ 安渡二丁目(防:安渡地区)	予定戸数:46戸				用地・設計・工事							
		オ 大槌(その他地区)	予定戸数:179戸				用地・設計・工事							
災害公営住宅	買収	カ 大ケロ(単独)	木造 予定戸数:70戸	用地	設計	★工事								
		キ 屋敷前(単独)	木造 予定戸数:21戸	用地	設計	★工事								
		ク 大ケロ二丁目(単独)	木造 予定戸数:22戸				用地	設計	工事					
		ケ 桧内地区(単独)	木造 予定戸数:13戸				用地	設計	工事					
		コ 三枚堂(単独)	木造 予定戸数:27戸				用地	設計	工事					
		サ 町方(区:町方地区)	予定戸数:209戸				用地	設計	工事					
		シ 吉里吉里(区:吉里吉里地区)	予定戸数:20戸				用地	設計	工事					
		ス 赤浜(防:赤浜地区)	予定戸数:22戸				用地	設計	工事					
		セ 浪板(単独)	予定戸数:15戸				用地	設計	工事					
		ソ 安渡(防:安渡地区)	予定戸数:31戸							用地・設計・工事				
		タ 寺野(防:寺野地区)	予定戸数:30戸				用地	設計	工事					

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

**基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)**

三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石

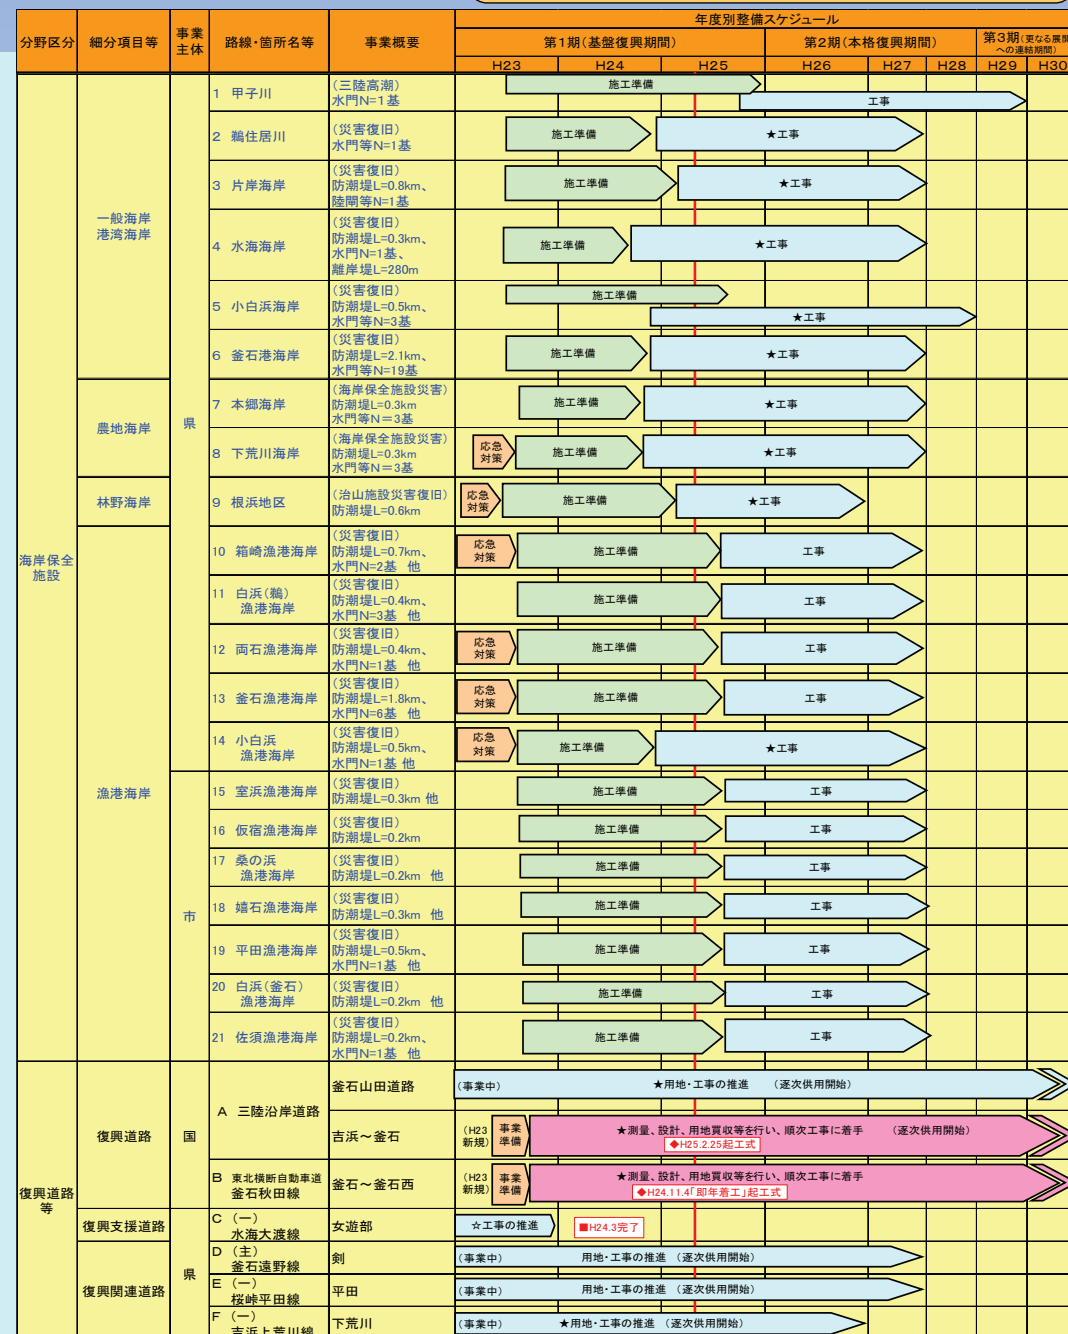

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。


問い合わせ先
【市】釜石市都市整備推進室（0193-22-2111）

凡 例

	3.11 浸水区域
	復興まちづくり

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
 ※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。


三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石

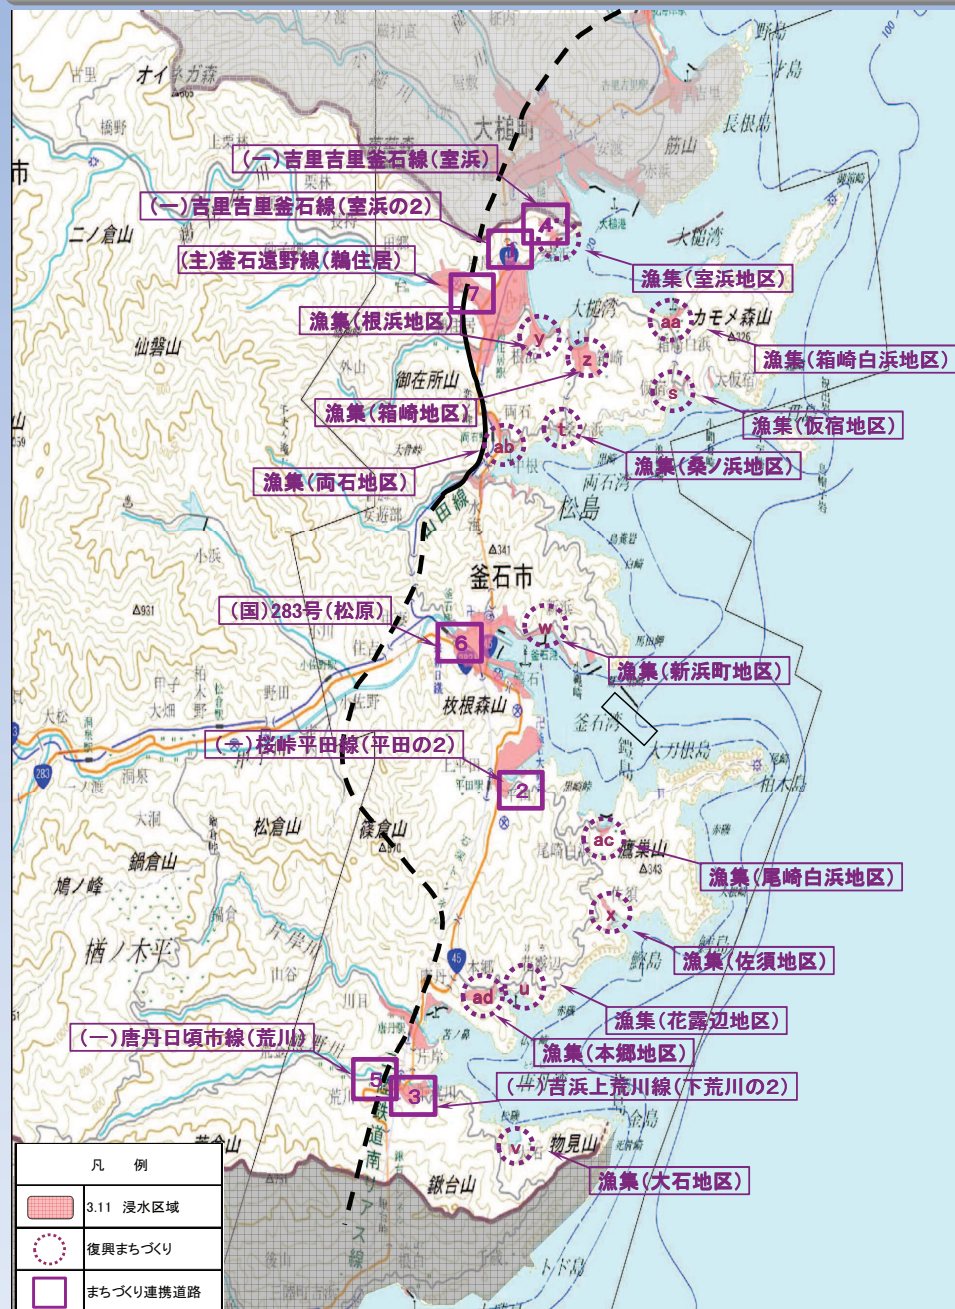

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる復興への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	r 室浜地区	集落道 他 対象戸数:4戸 (民4戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			s 仮宿地区	集落道、用地造成 他 対象戸数4戸 (民4戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			t 桑ノ浜地区	集落道 他	事業準備	設計、用地等		工事						
			u 花露辺地区	集落道 他	事業準備	設計、用地等		工事						
			v 大石地区	集落道 他	事業準備	設計、用地等		工事						
			w 新浜町地区	用地造成他	事業準備	設計、用地等		工事						
			x 佐須地区	用地造成他 対象戸数:12戸 (民8戸・公4戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			y 根浜地区	用地造成他 対象戸数:2戸 (民2戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			z 箱崎地区	用地造成他 対象戸数:21戸 (民21戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			aa 箱崎白浜地区	集落道 他 対象戸数:4戸 (民4戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			ab 岡石地区	用地造成他	事業準備	設計、用地等		工事						
			ac 尾崎白浜地区	避難路 他	事業準備	設計、用地等		工事						
			ad 本郷地区	用地造成他 対象戸数3戸 (民3戸)	事業準備	設計、用地等		工事						
			1路線	整備延長:1,300m				設計・工事等 津波復興拠点東部地区に移行						
			1 (一) 吉里吉里釜石線	室浜の2		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
まちづくり連携道路	県		2 (一) 桜峠平田線	平田の2		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			3 (一) 吉浜上荒川線	下荒川の2		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			4 (一) 吉里吉里釜石線	室浜		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			5 (一) 唐丹日頃市線	荒川		施工準備		用地買収	用地・工事の推進					
			6 (国)283号	松原					用地・工事の推進					
			7 (主)釜石遠野線	鶴住居					施工準備					
									用地・工事の推進					

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石

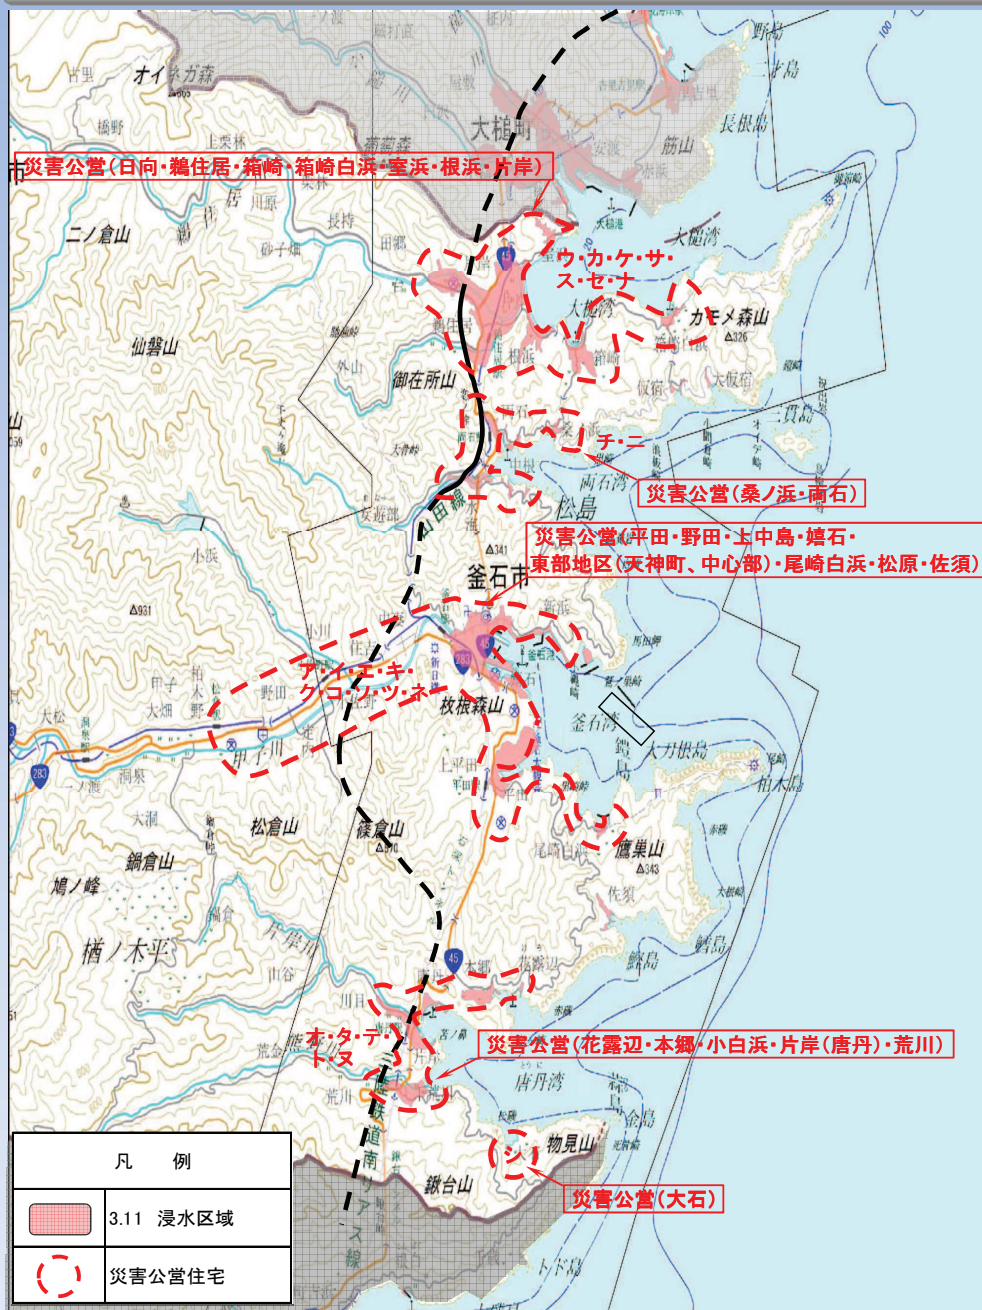

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への進捗期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
直接建設	県	ア 平田(単独)	RC造7階 予定戸数: 126戸	設計	★工事									
		イ 野田(単独)	RC造5階 予定戸数: 32戸	設計	★工事									
		ウ 日向(単独)	RC造5階 予定戸数: 24戸	用地	設計	工事								
		その他	予定戸数: 16戸			用地・設計・工事								
買収	市	エ-1 上中島(単独)	S造 予定戸数: 54戸	設計 ☆工事		54戸	■H25.3完了							
		エ-2 上中島(単独)	S造 予定戸数: 156戸			用地	設計	工事						
		オ 花露辺(防:花露辺地区)	RC造 予定戸数: 13戸	用地	設計	★工事								
		カ 鶴住居(区:鶴住居地区)	RC造 予定戸数: 135戸		用地	設計	工事							
		キ 蟠石(区:蟠石・松原地区)	RC造 予定戸数: 100戸		用地	設計	工事							
		ク 東部地区(天神町)(単独)	RC造 予定戸数: 40戸	用地	設計	工事								
		ケ 箱崎(防:箱崎地区)	木造 予定戸数: 37戸		用地	設計	工事							
		コ 尾崎白浜(単独)	木造 予定戸数: 5戸		用地	設計	工事							
		サ 箱崎白浜(単独)	木造 予定戸数: 10戸		用地	設計	工事							
		シ 大石(単独)	木造 予定戸数: 3戸		用地	設計	工事							
		ス 室浜(防:室浜地区)	木造 予定戸数: 19戸		用地	設計	工事							
		セ 根浜(防:根浜地区)	木造 予定戸数: 18戸		用地	設計	工事							
		ソ 東部地区(中心部)(単独)	RC造 予定戸数: 310戸		用地	設計	工事							
		タ 本郷(防:本郷地区)	木造 予定戸数: 16戸		用地		設計	工事						
		チ 桑ノ浜(防:桑ノ浜地区)	木造 予定戸数: 16戸		用地		設計	工事						
直接建設	市	ツ 松原(区:蟠石・松原地区)	RC造 予定戸数: 55戸		用地	設計	工事							
		テ-1 小白浜(単独)	RC造 予定戸数: 20戸		用地	設計	工事							
		テ-2 小白浜(防:小白浜地区)	RC造 予定戸数: 20戸		用地	設計	工事							
		ト 片岸(唐丹)(防:唐丹片岸地区)	木造 予定戸数: 10戸		用地	設計	工事							
		ナ 片岸(単独)	RC造 予定戸数: 80戸		用地	設計	工事							
		ニ 南石(防:南石地区)	予定戸数: 86戸		用地		設計							
		ヌ 荒川(防:荒川地区)	木造 予定戸数: 13戸		用地		設計	工事						
		ネ 佐須(漁:佐須地区)	木造 予定戸数: 4戸		用地		設計	工事						


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市 5／5】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】沿岸広域振興局土木部(0193-25-2714)
同 水産部(0193-25-2706)
【市】釜石市水産農林課(0193-22-2111)、(教)総務課(0193-22-8832)

三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石

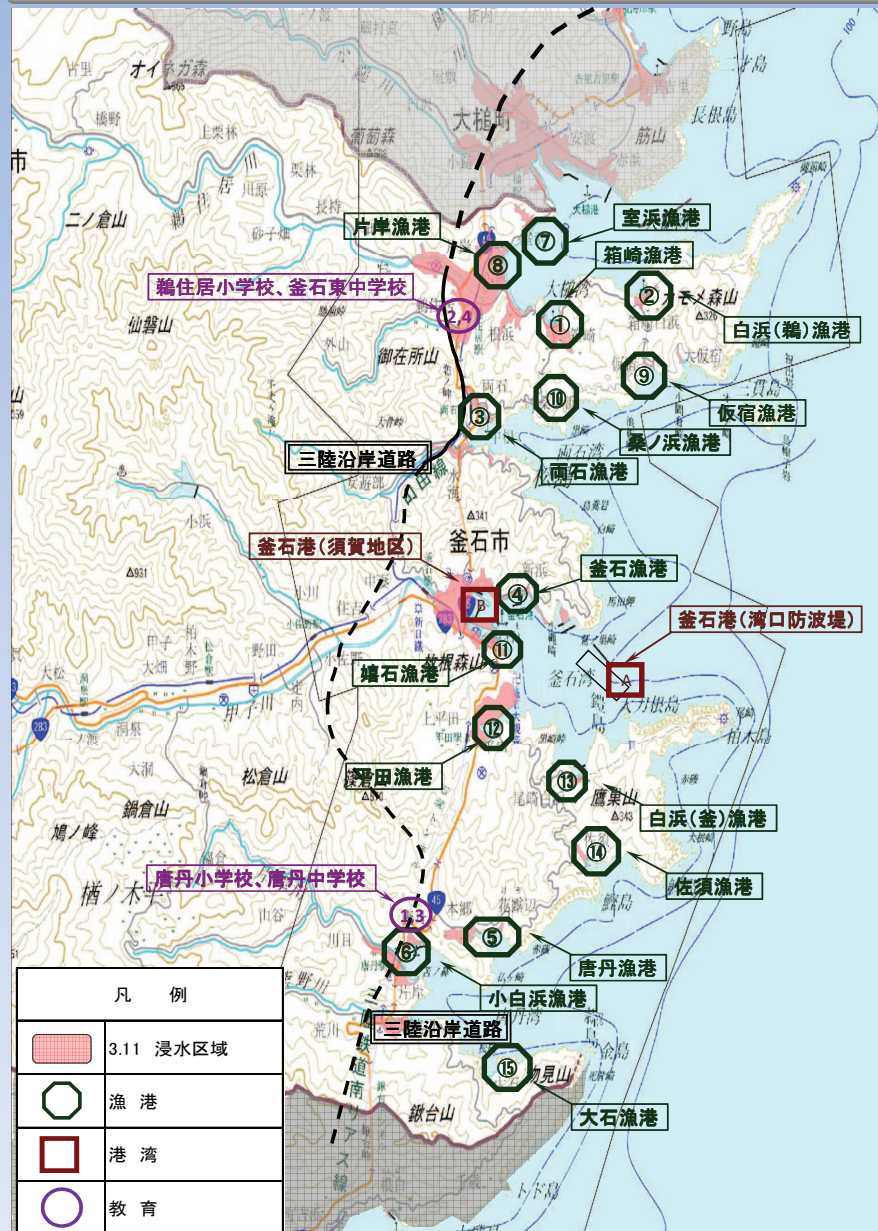

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への道)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
漁 港	漁 港	県	① 箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m、 岸壁L=889m 他	施工準備	★工事										
			② 白浜(鶴)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m、 岸壁L=504m 他	施工準備	★工事										
			③ 両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=834m 他	施工準備	★工事										
			④ 釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m、 岸壁L=1,898m 他	施工準備	★工事										
			⑤ 唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m、 岸壁L=572m 他	施工準備	★工事										
			⑥ 小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m、 岸壁L=834m 他	施工準備	★工事										
		市	⑦ 室浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=163m、 岸壁L=190m 他	施工準備	工事										
			⑧ 片岸漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=135m 他	施工準備	工事										
			⑨ 仮宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=130m、 岸壁L=60m 他	施工準備	★工事										
			⑩ 桑ノ浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=209m、 岸壁L=250m 他	施工準備	★工事										
			⑪ 蟠石漁港	(漁港災害) 防波堤L=76m、 岸壁L=304m 他	施工準備	★工事										
			⑫ 平田漁港	(漁港災害) 防波堤L=215m、 岸壁L=598m 他	施工準備	★工事										
			⑬ 白浜(釜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=449m、 岸壁L=378m 他	施工準備	★工事										
			⑭ 佐須漁港	(漁港災害) 防波堤L=174m、 岸壁L=103m 他	施工準備	★工事										
			⑮ 大石漁港	(漁港災害) 防波堤L=361m、 岸壁L=233m 他	施工準備	★工事										
港 湾	釜石港	国 A 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=1,660m	施工準備	★工事(平成27年度完成予定)											
		県 B 須賀地区	(災害復旧) 南防波堤L=266m、 -4.0m1号物揚場 L=200m、 -7.5m岸壁L=152m他	暫定供用	公共上屋★1号、★2号	★防波堤、★岸壁、★臨港道路				★物揚場						
教 育	小学校 中学校	市	1 唐丹小学校	(災害復旧) 移転	住民合意・事業準備	用地取得・設計	造成工事	校舎・体育館等建設		4校とも移転完了まで 仮設校舎を使用						
			2 鶴住居小学校	(災害復旧) 移転	住民合意・事業準備	用地取得・設計	造成工事	校舎・体育館等建設								
			3 唐丹中学校	(災害復旧) 現敷地で新築	住民合意・事業準備	用地取得・設計	造成工事	校舎・体育館等建設								
			4 釜石東中学校	(災害復旧) 移転	住民合意・事業準備	用地取得・設計	造成工事	校舎・体育館等建設								


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市 1 / 5】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)
大船渡農林振興センター(0192-41-0567)
大船渡水産振興センター(0192-27-5081)
【市】大船渡市水産課 (0192-27-3111)

命を守り、夢を育むまちづくりと
防災に協働するまち大船渡

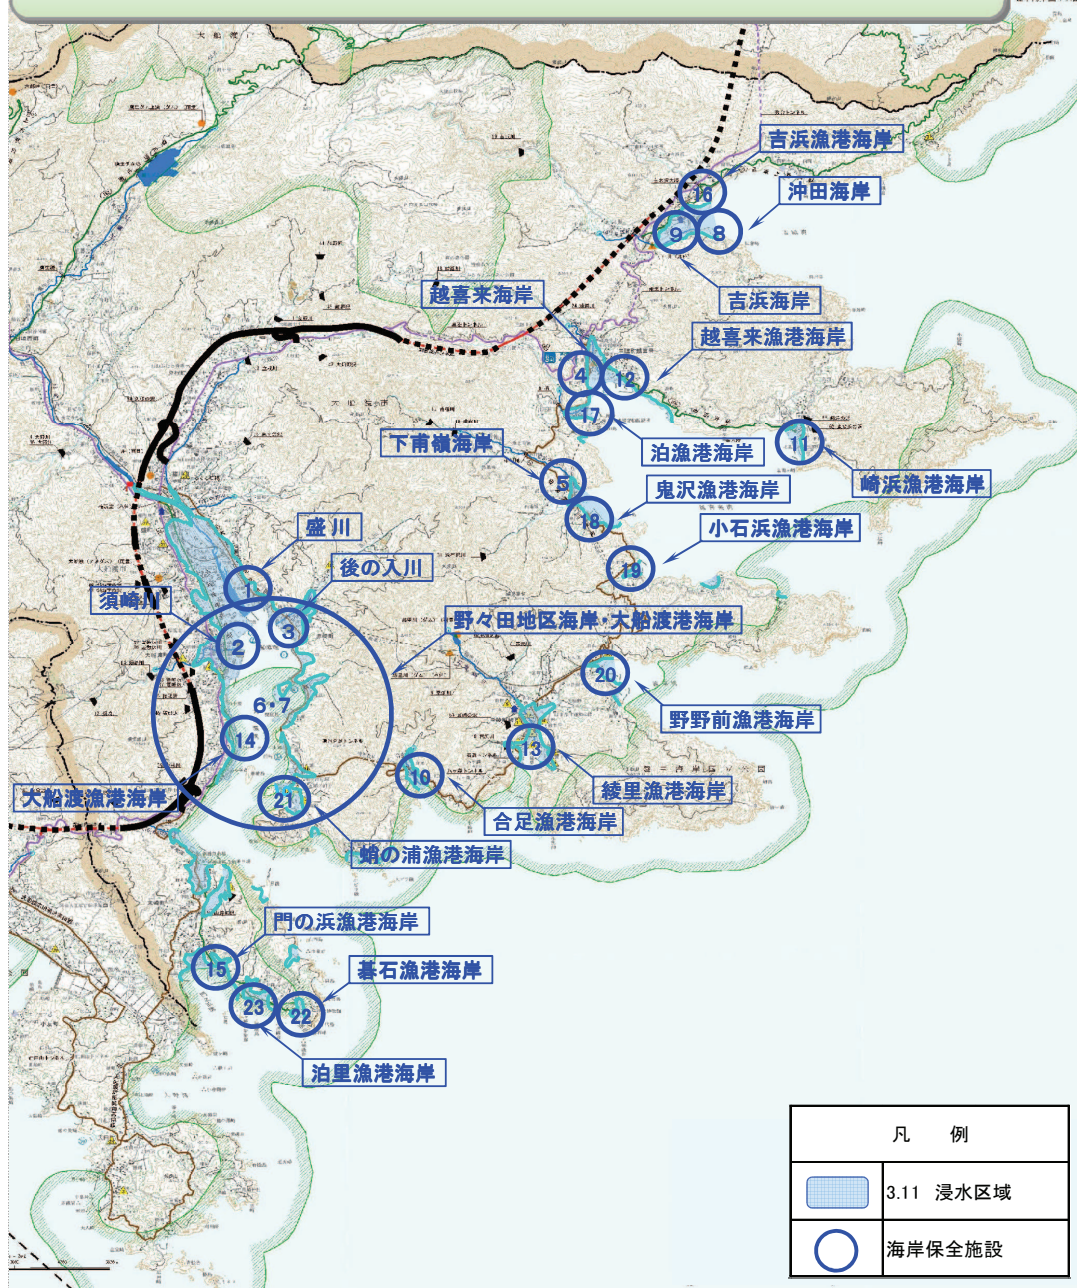

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる復興への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸・港湾海岸	県	1 盛川(塩場)	(災害復旧) 防潮堤L=2.3km	施工準備		★工事							
			2 須崎川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備		工事							
			3 後の入川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備		工事							
			4 越喜来海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、水門N=2基他	施工準備		★工事							
			5 下南嶺海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=2基他	施工準備		★工事							
			6 野々田地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km	施工準備		工事							
			7 大船渡港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、水門等N=38基	施工準備		★工事							
	農地海岸	市	8 沖田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km	施工準備	★工事		■H25.6完了						
			9 吉浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km、水門等N=2基	応急対策	施工準備	★工事							
			10 合足海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km、水門等N=2基	応急対策	施工準備	★工事							
			11 崎浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=3基 他		施工準備	工事							
	漁港海岸	市	12 越喜来漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基 他		施工準備	★工事							
			13 綾里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、水門N=3基 他		施工準備	工事							
			14 大船渡漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、水門N=11基 他		施工準備	工事							
			15 門の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備	★工事							
			16 吉浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他		施工準備	工事							
			17 泊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他		施工準備	工事							
			18 鬼沢漁港海岸	(災害復旧) 海岸護岸L=0.1km		施工準備	工事							
			19 小石浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他		施工準備	工事							
			20 野野前漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=2基 他		施工準備	工事							
			21 蛸ノ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=6基 他		施工準備	工事							
			22 碁石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備	工事							
			23 泊里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備	工事							


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市 2 / 5】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【市】大船渡市集団移転課、住宅公園課、
水産課(0192-27-3111)

命を守り、夢を育むまちづくりと 防災に協働するまち大船渡

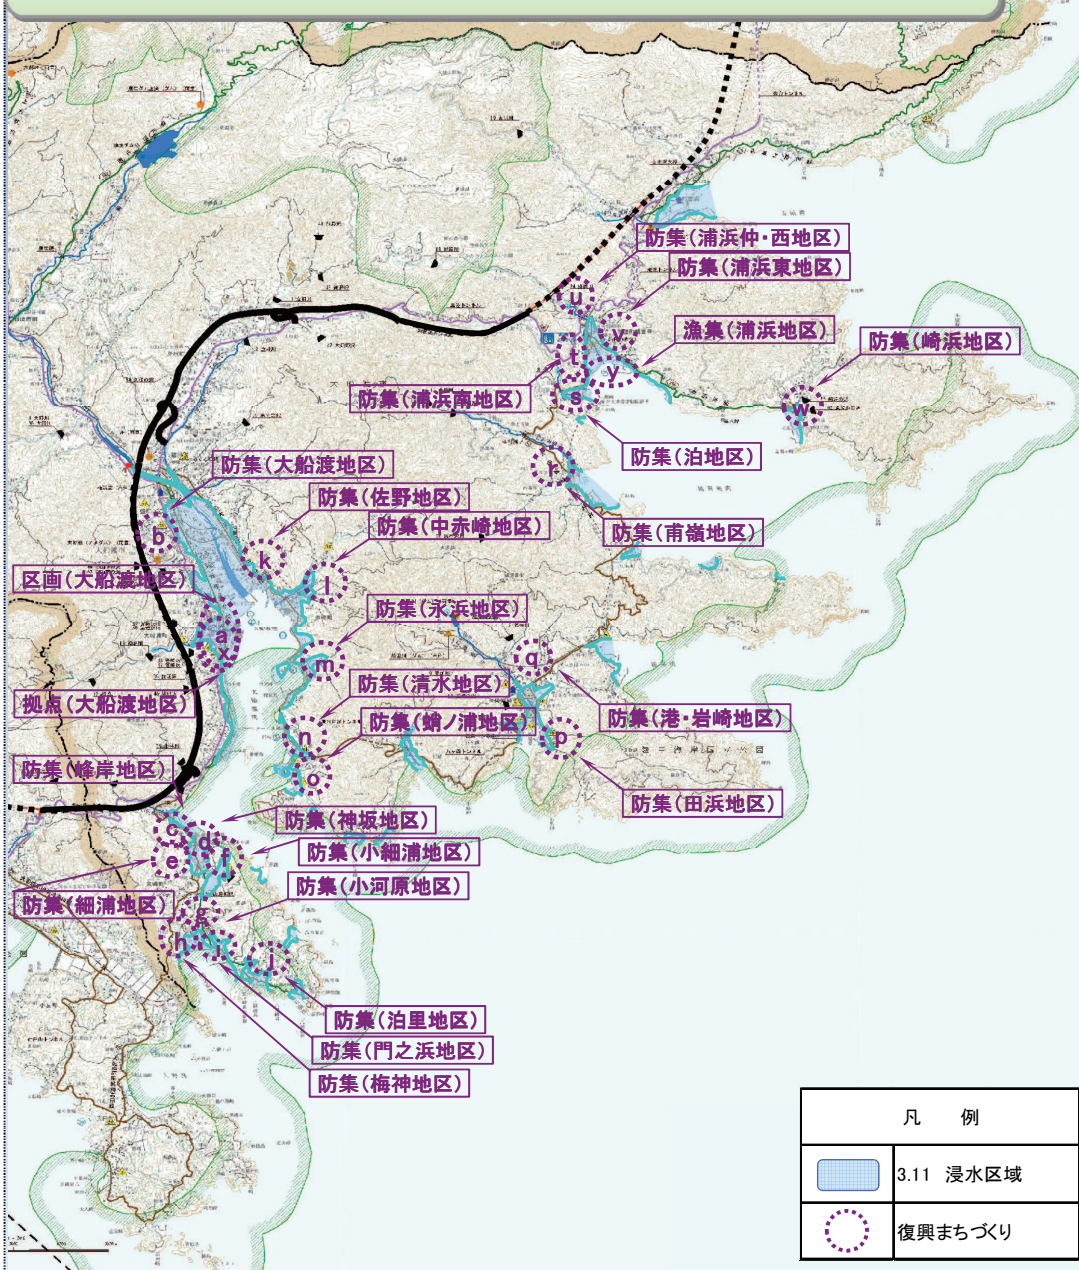

凡 例	
	3.11 浸水区域
	復興まちづくり

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる復興への継続期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
復興まちづくり	土地区画整理	市	a 大船渡駅前地区	区域面積: 約37.8ha 対象戸数: 300戸 (民300戸)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	用地	調査・設計等	工事	順次住宅建設				
			b 大船渡地区	対象戸数: 90戸 (民90戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			c 峰岸地区	対象戸数: 21戸 (民21戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査(埋文含む)・設計等	工事	住宅建設					
			d 神坂地区	対象戸数: 9戸 (民9戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			e 細浦地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			f 小細浦地区	対象戸数: 8戸 (民8戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設					
			g-1 小河原地区(平林)	対象戸数: 29戸 (民29戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			g-2 小河原地区(上山)	対象戸数: 6戸 (民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			g-3 小河原地区(鶴巻)	対象戸数: 6戸 (民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			h 梅神地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			i 門之浜地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設					
			j 泊里地区	対象戸数: 17戸 (民17戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			k 佐野地区	対象戸数: 5戸 (民5戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			l 中赤崎地区	対象戸数: 135戸 (民135戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			m 永浜地区	対象戸数: 33戸 (民33戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			n 清水地区	対象戸数: 6戸 (民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査等	工事	住宅建設					
			o 蛸ノ浦地区	対象戸数: 15戸 (民15戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			p 田浜地区	対象戸数: 12戸 (民12戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設					
			q 港・岩崎地区	対象戸数: 23戸 (民23戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設					
			r 南嶺地区	対象戸数: 検討中	※南嶺地区としての事業実施については再検討(他地区への統合または他事業などによる住宅再建になる場合があります)									
津波復興拠点	漁業集落防災機能強化	市	s 泊地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	★工事	住宅建設					
			t 浦浜南地区	対象戸数: 11戸 (民11戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			u 浦浜仲・西地区	対象戸数: 10戸 (民10戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	住宅建設					
			v 浦浜東地区	対象戸数: 12戸 (民12戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査(埋文含む)・設計等	工事	住宅建設					
			w 崎浜地区	対象戸数: 21戸 (民21戸)	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査(埋文含む)・設計等	工事	住宅建設					
			x-1 大船渡地区	区域面積: 約4.2ha (先行整備区域2.3ha)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定	用地	調査・設計等	工事					
			x-2 大船渡地区	区域面積: 約4.2ha (第2段階整備区域1.9ha)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定	用地	調査・設計等	工事					
			y 浦浜地区	集落道、用地造成地 対象戸数: 15戸 (民15戸)	事業準備	設計、用地等	工事							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)
【市】(教)生涯学習課(0192-27-3111内271)

凡 例	
	3.11 浸水区域
	まちづくり連携道路
	復興道路等
	港 湾
	教 育

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる復興への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興まちづくり	街路整備	県	路線数:1路線	整備延長:約2km				設計・工事等 土地区画整理大船渡駅周辺に移行						
			整備延長:約3km			事業準備			都市計画決定、事業認可		詳細設計・用地測量	工事		
	1 (一)崎浜港線		越喜来			施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
	2 (主)大船渡広田陸前高田線		船河原			施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
	3 (一)碓石海岸線		末崎〜碓石			施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
	4 (主)大船渡綾里三陸線		越喜来			施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	吉浜〜釜石	(H23新規) 事業準備	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始) ●H25.2.25起工式								
	復興関連道路	県	B (主)大船渡綾里三陸線	小石浜	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
港湾	大船渡港	県	1 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=535m	施工準備	★工事(平成27年度完成予定)								
			2 野々田地区	(災害復旧) 防波堤L=170m、須崎防波堤L=60m、-4.5m岸壁L=150m、-3.0m物揚場L=87m他	暫定供用	★臨時道路		★防波堤、★岸壁、★頭保安設備						
			3 茶屋前地区	(災害復旧) -9.0m岸壁L=428m、-6.0m岸壁L=105m、-3.0m物揚場L=376m、-4.0m物揚場L=197m他	暫定供用	★物揚場、★臨時道路		★岸壁、★頭保安設備						
			4 山口地区	(災害復旧) 防波堤L=64m、さん橋(-2.0m)L=32m、物揚場L=70m他	暫定供用	★防波堤、★さん橋 ★一部の物揚場、船揚場		一部の物揚場、船揚場、臨時道路						
			5 永浜地区	(災害復旧) 防波堤L=192m、-2.0m物揚場L=108m、-2.0m2号物揚場138m	暫定供用	★防波堤 ★一部の物揚場		一部供用		一部の物揚場				
			6 清水地区	(災害復旧) 防波堤L=109m、物揚場L=285m、船揚場L=98m	暫定供用	★防波堤 ★一部の船揚場		一部供用		一部の船揚場・臨時道路				
			7 赤土倉地区	(災害復旧) 南防波堤L=79m、北防波堤L=165m、-2.0m2号物揚場L=104m他	暫定供用	★防波堤 ★物揚場 ★臨時道路		一部供用		船揚場				
			教育	市	小学校	1 赤崎小学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意	用地取得・設計	移転完了まで鰯・浦小を使用				造成工事
2 越喜来小学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意				用地取得・設計	移転完了まで旧南嶺小を使用				造成工事	校舎・体育館等建設		
3 赤崎中学校	(災害復旧) 移転	事業準備・住民合意				用地取得・設計	移転完了まで仮設校舎を使用				造成工事	校舎・体育館等建設		


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市 4／5】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】大船渡土木センター (0192-27-9919)
【市】大船渡市集団移転課、住宅公園課 (0192-27-3111)

命を守り、夢を育むまちづくりと 防災に協働するまち大船渡

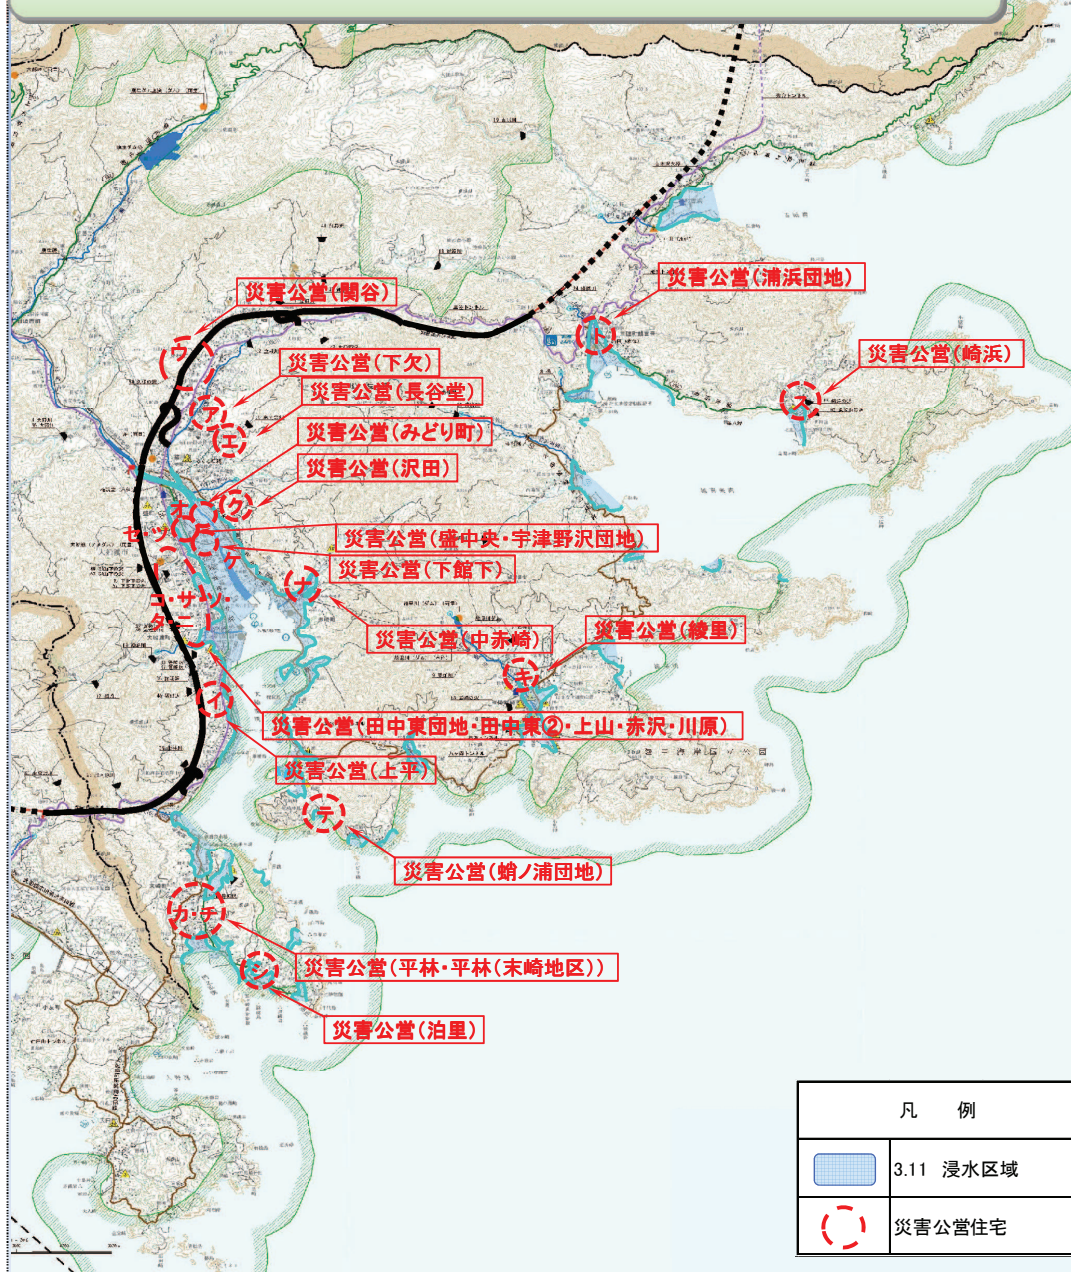


凡 例	
	3.11 浸水区域
	災害公営住宅

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連絡期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
県	直接建設		ア 下欠(単独)	RC造3階 予定戸数:33戸	用地	設計	工事	33戸						
			イ 上平(単独)	RC造7階 予定戸数:65戸	用地	設計	工事	65戸						
			ウ 関谷(単独)	RC造5階 予定戸数:80戸	用地	設計	工事	80戸						
			エ 長谷堂(単独)	RC造3階 予定戸数:53戸	用地	設計	工事	53戸						
			オ みどり町(単独)	RC造5階 予定戸数:120戸	用地	設計	工事	120戸						
	設計・施工一括選定		カ 平林(単独)	RC造4階 予定戸数:56戸	用地		設計・工事	56戸						
			キ 綾里(単独)	RC造3階 予定戸数:30戸	用地		設計・工事	30戸						
			ク 沢田(単独)	RC造3階 予定戸数:20戸	用地		設計・工事	20戸						
			ケ 下館下(単独)	RC造8階 予定戸数:60戸		用地	設計・工事	60戸						
			その他	予定戸数:46戸			用地・設計・工事	46戸						
市	直接建設		コ 田中東団地(大船渡地区)(単独)	木造2階 予定戸数:12戸	設計	☆工事	■H25.3完了							
			サ 田中東②(大船渡地区)(単独)	木造2階 予定戸数:7戸	用地	設計	☆工事	7戸						
			シ 泊里(末崎地区)(単独)	木造平屋 予定戸数:6戸		用地・造成	設計	工事	6戸					
			ス 崎浜(越喜来地区)(単独)	木造平屋 予定戸数:8戸		用地	設計	工事	8戸					
			セ 盛中央(単独)	RC造5階 予定戸数:44戸	☆買収		■H24.12入居開始	44戸						
	買収(雇用促進住宅)		ソ 上山(大船渡地区)(単独)	RC造3階 予定戸数:11戸	用地・造成	設計	☆工事	11戸						
			タ 赤沢(大船渡地区)(単独)	RC造5階 予定戸数:23戸	用地・造成	設計	☆工事	23戸						
	買収		チ 平林(末崎地区)(単独)	RC造3階 予定戸数:11戸	用地・造成	設計	☆工事	11戸						
			ツ 宇津野沢団地(単独)	RC造3階 予定戸数:20戸	用地・造成	設計	☆工事	20戸						
			テ 蛸ノ浦団地(赤崎地区)(単独)	RC造等 予定戸数:21戸		用地	設計	造成	21戸					
			ト 浦浜団地(越喜来地区)(単独)	RC造等 予定戸数:30戸		用地	設計	造成	30戸					
			ナ 中赤崎(赤崎地区)(単独)	RC造等 予定戸数:42戸		用地	設計	造成	42戸					
			ニ 川原(単独)	RC造等 予定戸数:30戸		用地	設計	造成	30戸					
							設計	工事						

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

命を守り、夢を育むまちづくりと
防災に協働するまち大船渡

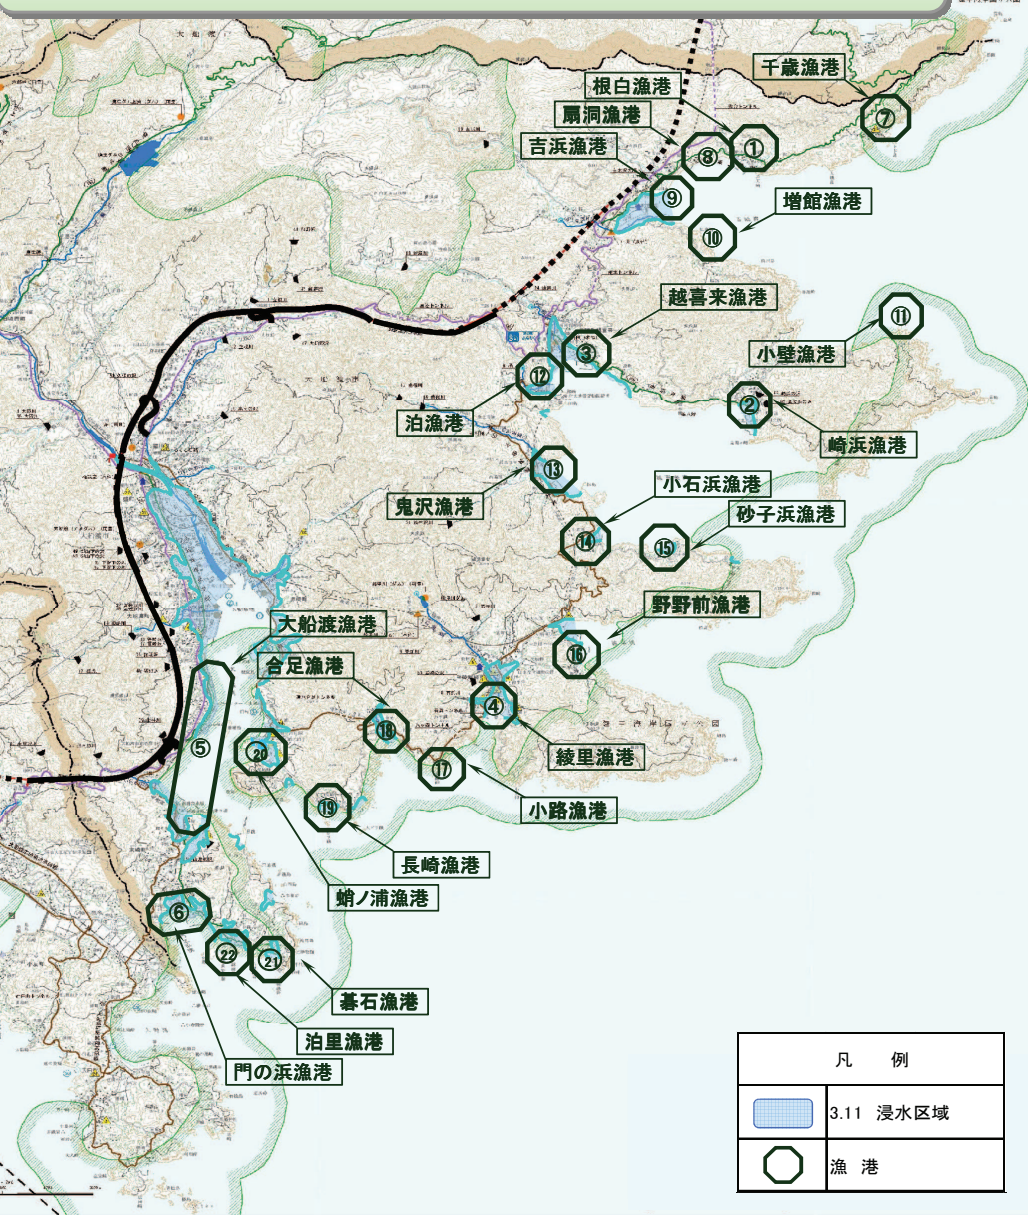

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる復興への道筋)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
漁 港	県		① 根白漁港	(漁港災害) 防波堤L=748m、 岸壁L=638m 他	施工準備		★工事							
			② 崎浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=721m、 岸壁L=827m 他	施工準備		★工事							
			③ 越喜来漁港	(漁港災害) 防波堤L=580m、 岸壁L=436m 他	施工準備		★工事							
			④ 綾里漁港	(漁港災害) 防波堤L=402m、 岸壁L=1,102m 他	施工準備		★工事							
			⑤ 大船渡漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,263m、 岸壁L=3,512m 他	施工準備		★工事							
			⑥ 門の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=907m、 岸壁L=575m 他	施工準備		★工事							
			⑦ 千歳漁港	(漁港災害) 防波堤L=212m、 岸壁L=108m 他	施工準備		★工事							
			⑧ 扇洞漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=23m 他	施工準備		★工事							
			⑨ 吉浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=223m、 岸壁L=185m 他	施工準備		★工事							
			⑩ 増館漁港	(漁港災害) 防波堤L=137m、 岸壁L=15m 他	施工準備		★工事							
			⑪ 小壁漁港	(漁港災害) 岸壁L=44m 他	施工準備		★工事							
	市		⑫ 泊漁港	(漁港災害) 防波堤L=283m、 岸壁L=202m 他	施工準備		★工事							
			⑬ 鬼沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=329m、 岸壁L=209m 他	施工準備		★工事							
			⑭ 小石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=422m、 岸壁L=239m 他	施工準備		★工事							
			⑮ 砂子浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=176m、 岸壁L=247m 他	施工準備		★工事							
			⑯ 野野前漁港	(漁港災害) 防波堤L=781m、 岸壁L=484m 他	施工準備		★工事							
			⑰ 小路漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、 岸壁L=65m 他	施工準備		★工事							
			⑱ 合足漁港	(漁港災害) 防波堤L=81m、 岸壁L=45m 他	施工準備		★工事							
			⑲ 長崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=482m、 岸壁L=475m 他	施工準備		★工事							
			⑳ 蛸ノ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=239m、 岸壁L=972m 他	施工準備		★工事							
			㉑ 基石漁港	(漁港災害) 防波堤L=123m、 岸壁L=104m 他	施工準備		★工事							
			㉒ 泊里漁港	(漁港災害) 防波堤L=211m、 岸壁L=248m 他	施工準備		★工事							


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 1 / 4】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)
大船渡農林振興センター(0192-27-8541)
大船渡水産振興センター(0192-27-5081)
医療局(019-829-6347)
【市】陸前高田市水産課、健康推進課(0192-54-2111)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

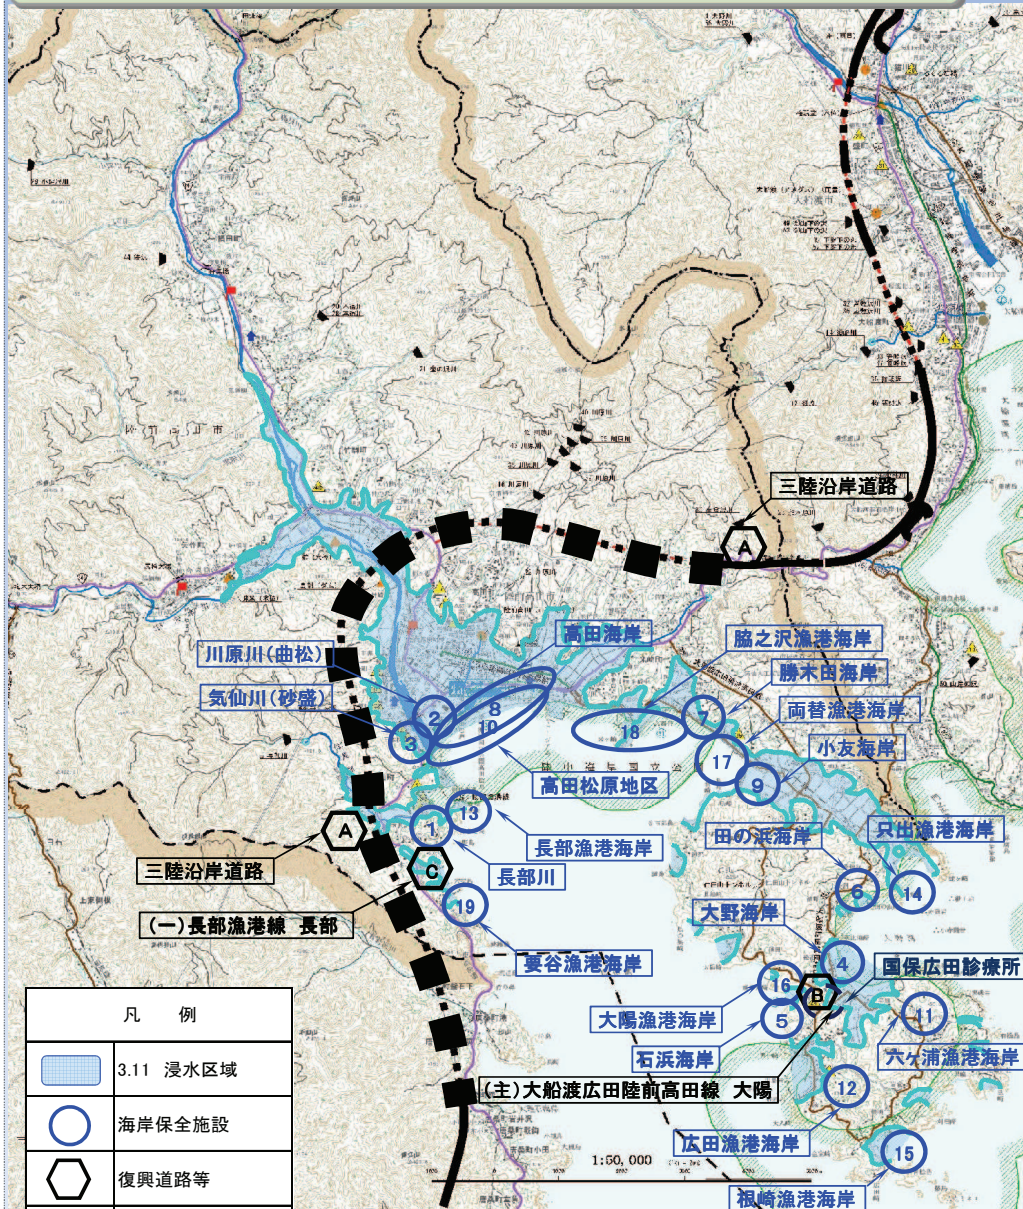

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる発展への進展期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	施工準備			工事						
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	施工準備			★工事						
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基	施工準備			★工事						
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、離岸堤L=0.3km他	施工準備			工事						
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、離岸堤L=0.12km他	施工準備	★工事								
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、消波工L=0.02km他	施工準備	☆工事	■H25.1完了							
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	施工準備			工事						
			8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	応急対策	施工準備		★工事						
	農地海岸	県	9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.5km 水門等N=3基	応急対策	施工準備		工事						
			10 高田松原地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km	施工準備			工事						
	漁港海岸	市	11 六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備		工事						
			12 広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=10基 他	施工準備			★工事						
			13 長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	施工準備			工事						
			14 只出漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備		工事						
			15 根崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 他	施工準備			工事						
			16 大陽漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	施工準備			工事						
			17 両替漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=3基 他	応急対策	施工準備		工事						
			18 脇之沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=9基 他	応急対策	施工準備		★工事						
			19 要谷漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、水門N=7基 他	施工準備			工事						
復興道路等	復興道路	国	A 高田道路		(事業中)	★用地・工事の推進								
			A 三陸沿岸道路	唐桑北～陸前高田	(H23 事業新規)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)	◆H25.2.6起工式							
	復興関連道路	県	B (主)大船渡広田陸前高田線	大陽	(H24 新規)	施工準備	用地買収	用地・工事の推進						
			C (一)長部漁港線	長部	(事業中)	☆用地・工事の推進	■H24.8.24供用開始							
医療	病院	県	県立高田病院	(建設場所・規模・機能は未定)			建設場所の選定							
	医科診療所	市	国保広田診療所	診療所施設整備				用地取得・造成	設計	工事				


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 2／4】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先
【市】陸前高田市建設課、都市計画課、復興対策局(0192-54-2111)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

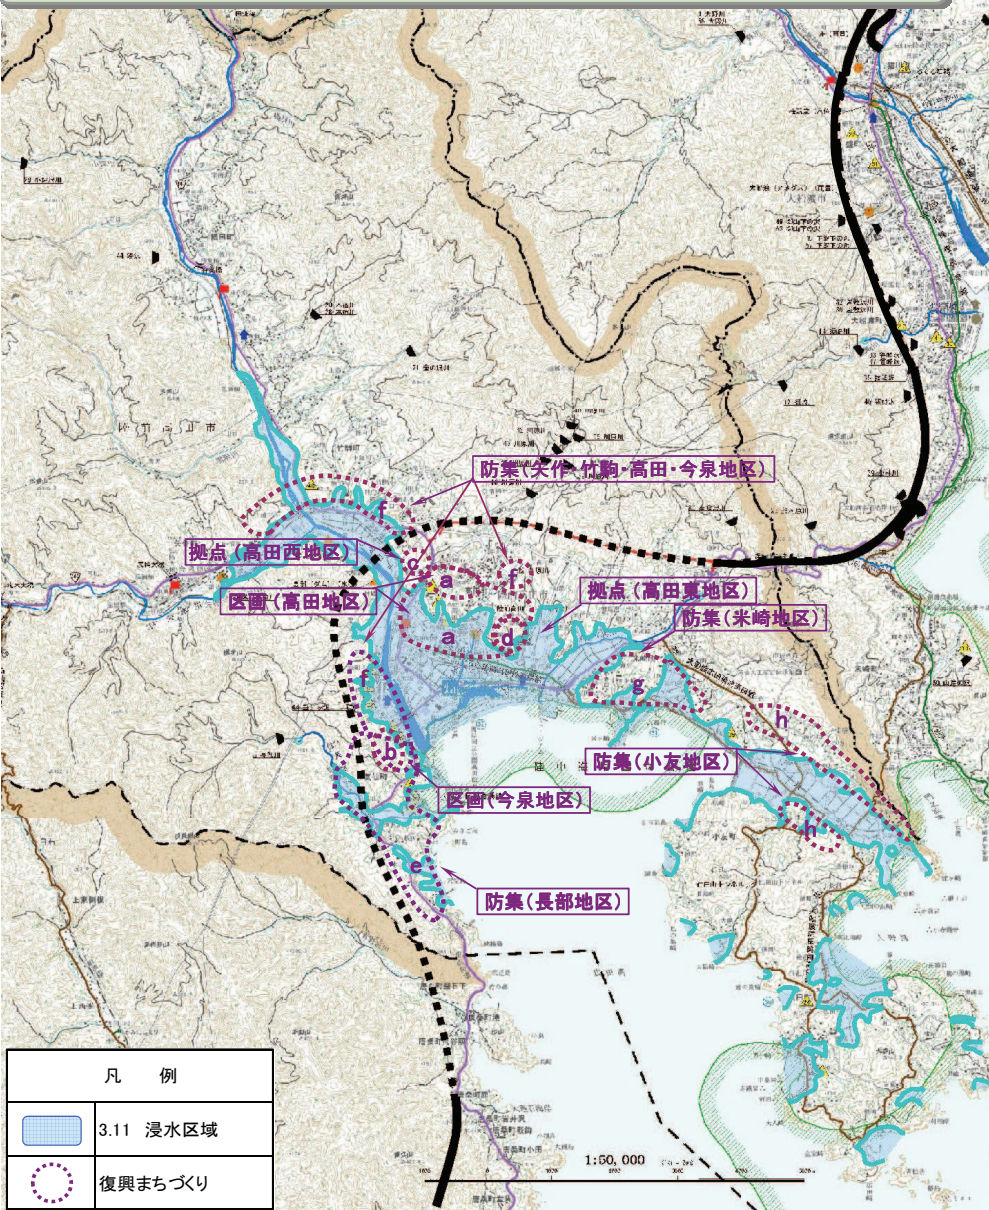

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
土地区画整理	a 高田地区	区域面積: 192.4ha 対象戸数 1,563戸 (民1,443戸・公120戸)		都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等
					事前準備	調査・設計等	用地	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)
	b 今泉地区	区域面積: 124.3ha 対象戸数 550戸 (民400戸・公150戸)		都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等	都市計画決定・事業計画策定等
					事前準備	調査・設計等	用地	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)	★工事等(県街路含む)
津波復興拠点	c 高田西地区	区域面積: 9.6ha		事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備
	d 高田東地区	区域面積: 9.1ha		事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備	事業準備
	e-1 長部地区(月山)	対象戸数: 54戸 (民54戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	e-2 長部地区(上長部)	対象戸数: 18戸 (民18戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
復興まちづくり	e-3 長部地区(双六)	対象戸数: 12戸 (民12戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	e-4 長部地区(要谷)	対象戸数: 7戸 (民7戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	e-5 長部地区(福伏)	対象戸数: 7戸 (民7戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	e-6 長部地区(今泉)	対象戸数: 15戸 (民15戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	f-1 矢作・竹駒・高田・今泉地区(下矢作)	対象戸数: 6戸 (民6戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	f-2 矢作・竹駒・高田・今泉地区(館)	対象戸数: 10戸 (民10戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	f-3 矢作・竹駒・高田・今泉地区(下沢)	対象戸数: 6戸 (民6戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	f-4 矢作・竹駒・高田・今泉地区(高田)	対象戸数: 56戸 (民56戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	f-5 矢作・竹駒・高田・今泉地区(今泉)	対象戸数: 40戸 (民40戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	g-1 米崎地区(堂の前)	対象戸数: 5戸 (民5戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	g-2 米崎地区(臨の沢)	対象戸数: 188戸 (民128戸・公60戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	h-1 小友地区(南緯)	対象戸数: 15戸 (民15戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	h-2 小友地区(三日市)	対象戸数: 5戸 (民5戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	h-3 小友地区(柳沢)	対象戸数: 9戸 (民9戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	h-4 小友地区(茂里花)	対象戸数: 5戸 (民5戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	h-5 小友地区(新田)	対象戸数: 8戸 (民8戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意
	h-6 小友地区(只出)	対象戸数: 14戸 (民14戸)		事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意	事業準備・住民合意


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 3／4】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)
教育委員会事務局(019-629-6106)
【市】陸前高田市建設課、都市計画課、復興対策局、

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

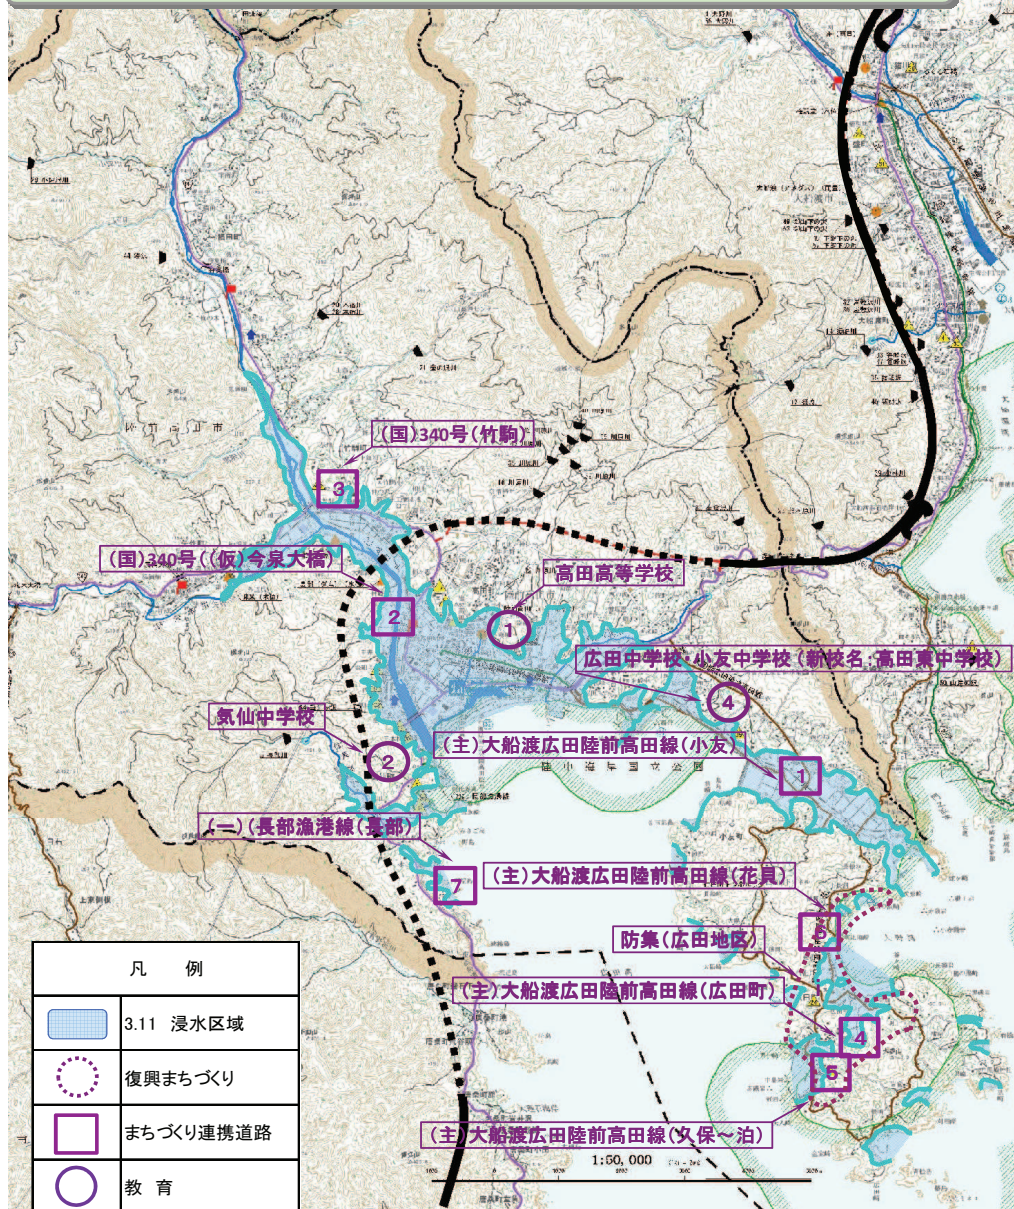

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)		第2期(本格復興期間)				第3期(更なる展開への準備期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
防災集団移転	市		I-1 広田地区(長洞)	対象戸数:14戸(民14戸)	事業準備・住民合意	事業計画・設計等	★工事	順次住宅建設						
			I-2 広田地区(大野)	対象戸数:7戸(民7戸)	事業準備・住民合意	事業計画・設計等	★工事	順次住宅建設						
			I-3 広田地区(広田大野)	対象戸数:25戸(民25戸)	事業準備・住民合意	事業計画・設計等	★工事	順次住宅建設						
			I-4 広田地区(田谷)	対象戸数:41戸(民41戸)	事業準備・住民合意	事業計画・調査・設計等	★工事	順次住宅建設						
			I-5 広田地区(六ヶ浦)	対象戸数:7戸(民7戸)	事業準備・住民合意	事業計画・設計等	★工事	順次住宅建設						
			I-6 広田地区(泊第一)	対象戸数:6戸(民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画・調査・設計等	★工事	順次住宅建設						
			I-7 広田地区(泊第二)	対象戸数:10戸(民10戸)	事業準備・住民合意	事業計画・調査・設計等	★工事	順次住宅建設						
			I-8 広田地区(泊第三)	対象戸数:11戸(民11戸)	事業準備・住民合意	事業計画・調査・設計等	★工事	順次住宅建設						
			I-9 広田地区(中沢)	対象戸数:9戸(民9戸)	事業準備・住民合意	事業計画・設計等	★工事	順次住宅建設						
			I-10 広田地区(久保)	対象戸数:6戸(民6戸)	事業準備・住民合意	事業計画・設計等	★工事	順次住宅建設						
復興まちづくり	街路整備		1 路線	整備延長:2,200m				設計・工事等						
								土地区画整理 高田地区に移行						
	まちづくり連携道路	県	1 (主)大船渡広田陸前高田線	小友	施工準備			用地買収	用地・工事の推進					
			2 (国)340号	(仮)今泉大橋・大石沖	施工準備			用地買収	用地・工事の推進					
			3 (国)340号	竹駒	施工準備			用地買収	用地・工事の推進					
			4 (主)大船渡広田陸前高田線	広田町	施工準備			用地買収	用地・工事の推進					
			5 (主)大船渡広田陸前高田線	久保～泊	施工準備			用地買収	用地・工事の推進					
			6 (主)大船渡広田陸前高田線	花貝	施工準備			用地買収	用地・工事の推進					
			7 (一)長部漁港線	長部	施工準備			用地買収	用地・工事の推進					
教育	高等学校	県	1 高田高等学校	(災害復旧)校舎、第一体育館、第二体育館・柔剣道場・防災対応施設	用地・設計	★完成	設計	★第一体育館 校舎等 建設						
	小学校	市	2 気仙小学校	(災害復旧)移転	事業準備・住民合意						H25 長部小と統合移転完了まで現在の長部小を使用			
	中学校	市	3 気仙中学校	協議・調整中	住民合意						学校統合等について、地域住民等と協議・調整中			
			4 広田中学校 小友中学校	(災害復旧)移転	事業準備・住民合意	用地取得・設計		造成工事			H25 米崎中と3校統合(新校名:高田東中)移転完了まで現在の米崎中を使用			


※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 4/4】

基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)
大船渡水産センター(0192-27-5081)
【市】陸前高田市建設課、都市計画課、復興対策局、水産課
(0192-54-2111)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

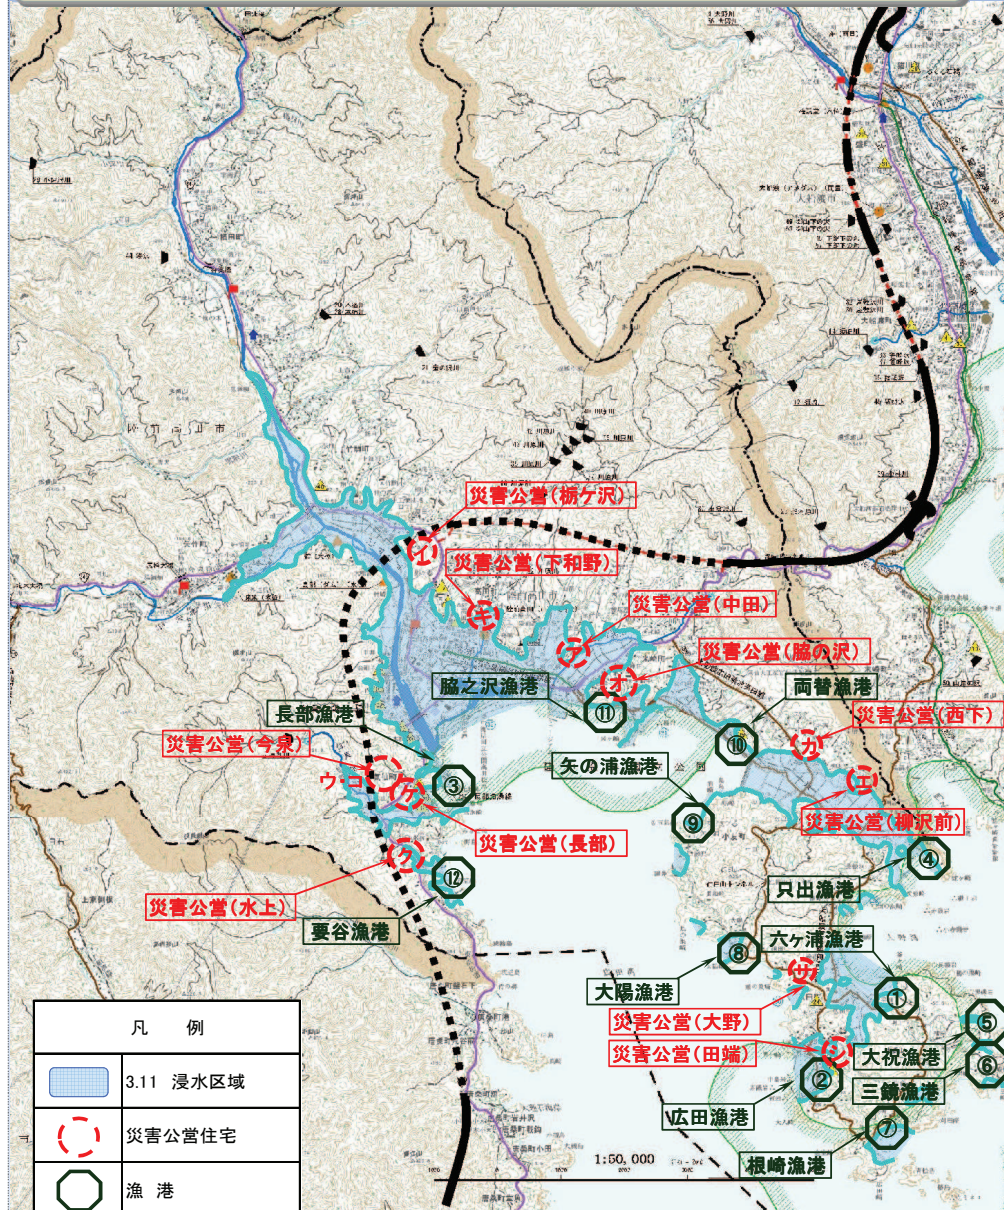

区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる復興への準備期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 中田(単独)	RC造8階 予定戸数:197戸	用地	設計	★工事	197戸						
			イ 柳ヶ沢(単独)	RC造8階 予定戸数:300戸	用地・造成	設計	工事	300戸						
			ウ 今泉(区:今泉地区)	RC造 予定戸数:60戸	用地	設計	★工事	60戸						
			エ 柳沢前(単独)	RC造3階 予定戸数:28戸	用地	設計	工事	28戸						
			オ 脇の沢(防:米崎地区)	RC造 予定戸数:60戸			用地・設計・工事	60戸						
	設計・施工一括選定	市	カ 西下(単独)	RC造4階 予定戸数:40戸	用地	設計・工事	40戸							
			その他	予定戸数:15戸			用地・設計・工事	15戸						
	買収	市	キ 下和野(区:高田地区)	RC造7階 予定戸数:120戸	用地・造成	設計	★工事	120戸						
			ク 水上(単独)	RC造3階 予定戸数:30戸	用地	設計	工事	30戸						
			ケ 長部(区:今泉地区)	RC造3階 予定戸数:30戸			用地	設計	工事					
			コ 今泉(区:今泉地区)	RC造3階 予定戸数:60戸			用地	設計	工事	60戸				
			サ 大野(単独)	RC造3階 予定戸数:40戸		用地	設計	工事	40戸					
			シ 田端(単独)	RC造3階 予定戸数:20戸		用地	設計	工事	20戸					
			① 六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m、 岸壁L=474m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			② 広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m、 岸壁L=1,176m 他	施工準備	応急対策	★工事							
漁港	漁港	市	③ 長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m、 岸壁L=1,180m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			④ 只出漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=298m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			⑤ 大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=99m、 岸壁L=43m 他	施工準備	応急対策	工事							
			⑥ 三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m、 岸壁L=36m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			⑦ 根崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=354m、 岸壁L=150m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			⑧ 大陽漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=79m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			⑨ 矢の浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=136m、 岸壁L=183m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			⑩ 両替漁港	(漁港災害) 防波堤L=274m、 岸壁L=254m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			⑪ 脇の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,149m、 岸壁L=531m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			⑫ 要谷漁港	(漁港災害) 防波堤L=556m、 岸壁L=279m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			⑬ 大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=274m、 岸壁L=254m 他	施工準備	応急対策	★工事							
			⑭ 三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m、 岸壁L=36m 他	施工準備	応急対策	★工事							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 【その他の市町村】 基準日：平成25年7月31日
(平成25年8月8日公表)

【問い合わせ先】
岩手県土木整備部 道路建設課 (TEL 019-629-5868)

沿岸12市町村以外における事業計画工程表【復興道路、復興支援道路】

番号	路線名	市町村名	箇所名
<復興道路(直轄事業)>			
A	東北横断自動車道 金石秋田線	遠野市	遠野住田～遠野
B	東北横断自動車道 金石秋田線	遠野市	遠野～宮守
C	東北横断自動車道 ～北巻市 金石秋田線	遠野市	宮守～東和
D	宮古盛岡横断道路	宮古市 ～盛岡市	区界～築川
E	宮古盛岡横断道路	盛岡市	都南川目道路
<復興道路(県事業)>			
▲	宮古盛岡横断道路	盛岡市	築川道路
<復興支援道路>			
1	国 106号	盛岡市	川目
2	国 107号	奥州市	札押道路
3	国 107号	奥州市	梁川～口内
4	国 281号	岩手町	大坊
5	国 281号	岩手町	大坊の2
6	国 283号	遠野市	上郷道路
7	国 284号	一関市	真滝B P
8	国 284号	一関市	室根B P
9	国 284号	一関市	石法華
10	国 340号	遠野市	土淵B P
11	国 340号	遠野市	立丸峠
12	国 340号	九戸村	泥ノ木
13	国 340号	軽米町	駒板
14	国 340号	住田町	山谷
15	国 340号	葛巻町	四日市
16	国 342号	一関市	花泉B P
17	国 342号	一関市	白崖
18	国 343号	一関市	大原
19	国 343号	一関市	一ノ通
20	国 397号	住田町	子飼沢
21	国 397号	奥州市	分限城～赤金
22	国 397号	住田町	高屋敷
23	国 397号	住田町	津付道路
24	国 397号	奥州市	小谷木橋
25	一 遠野住田	遠野市	新里

凡例

復興道路


：H23新規

：事業中

復興支援道路

：H25新規

：事業中

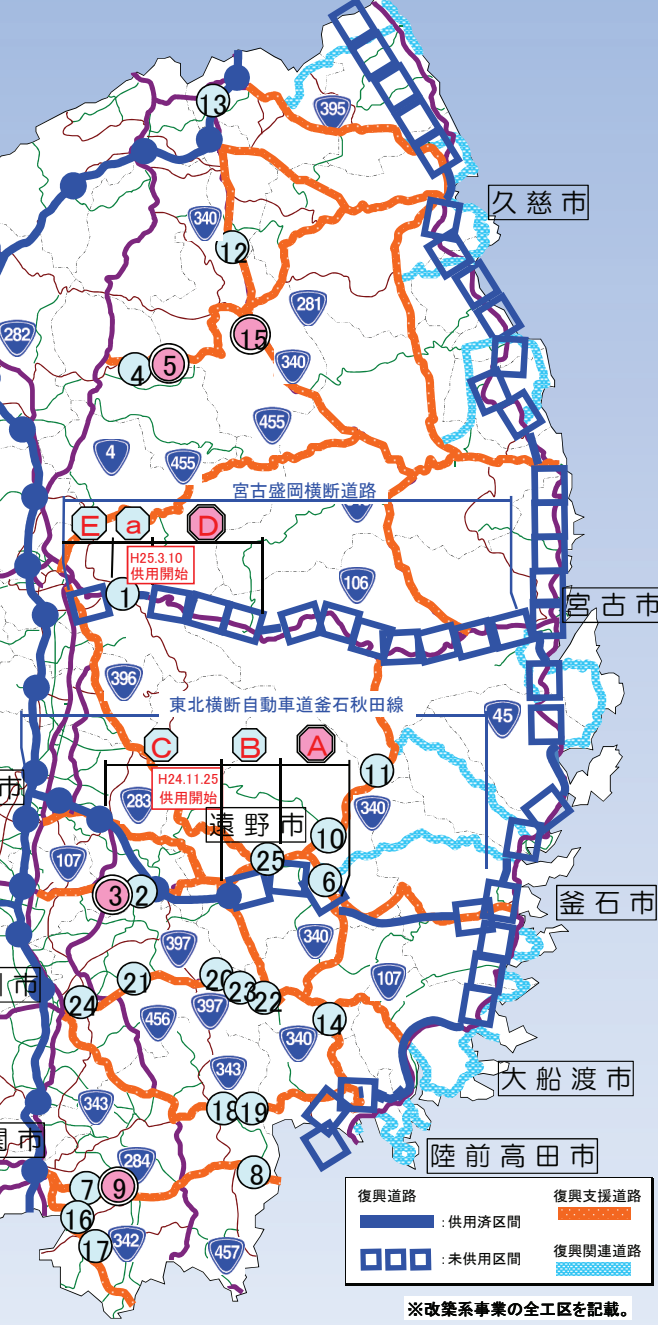

復興道路

：供用済区間

：未供用区間

復興支援道路

：復興関連道路

※改築系事業の全区区を記載。 ※路線、箇所は、今後、変更する可能性があります。

区分	種別	路線名	番号	市町村名	箇所名	年度別整備スケジュール									
						第1期(基礎復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
						H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
直轄事業	復興道路	東北横断自動車道 金石秋田線	A	遠野市	遠野住田～遠野	(H23 新規) 事業準備		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.8.16起工式							
			B	遠野市	遠野～宮守	(事業中)	★用地・工事の推進								
			C	遠野市 ～北巻市	宮守～東和	(事業中) ☆用地・工事の推進		■H24.11.25供用開始							
	復興道路	宮古盛岡横断道路	D	宮古市 ～盛岡市	区界～築川	(H23 新規) 事業準備		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			E	盛岡市	都南川目道路		★用地・工事の推進 ※川目～田の沢 H27開通予定								
県事業	復興支援道路	宮古盛岡横断道路	a	盛岡市	築川道路	(事業中) ☆用地・工事の推進		■H25.3.10供用開始							
			1	盛岡市	川目	(H24 新規) ☆用地・工事の推進		■H25.3.10供用開始							
			2	奥州市	札押道路	(事業中) ☆工事の推進		■H23.10.26供用開始							
			3	奥州市	梁川～口内		(H25 新規) 施工準備	用地買収		用地・工事の推進					
			4	岩手町	大坊	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			5	岩手町	大坊の2		(H25 新規) 施工準備	用地買収		用地・工事の推進 (逐次供用開始)					
			6	遠野市	上郷道路	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			7	一関市	真滝B P	(事業中) ☆工事の推進		■H24.8.7供用開始							
			8	一関市	室根B P	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			9	一関市	石法華		(H25 新規) 施工準備	用地買収		用地・工事の推進					
			10	遠野市	土淵B P	(事業中)	★用地・工事の推進 ■H24.7.22一部供用開始								
			11	遠野市 (宮古市) ※宮古市の復興支援道路(国道340号立丸峠と同一箇所)	立丸峠	(H24 新規) 施工準備	用地買収		用地・工事の推進 (逐次供用開始)						
			12	九戸村	泥ノ木	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			13	軽米町	駒板	(H24 新規) 施工準備	用地買収		用地・工事の推進						
			14	住田町	山谷	(H24 新規) 施工準備	用地買収		用地・工事の推進 (逐次供用開始)						
			15	葛巻町	四日市	(H25 新規) 施工準備	用地買収		用地・工事の推進						
			16	一関市	花泉B P	(事業中)	一部区間供用開始	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)							
			17	一関市	白崖	(H24 新規) 施工準備	用地買収		用地・工事の推進 (逐次供用開始)						
			18	一関市	大原	(事業中) ★用地・工事の推進 (逐次供用開始)									
			19	一関市	一ノ通		(H25 新規) 施工準備	用地買収		用地・工事の推進					
			20	住田町	子飼沢		★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			21	奥州市	分限城～赤金	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			22	住田町	高屋敷	(事業中)	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
			23	住田町	津付道路	(事業中)	★用地・工事の推進								
			24	奥州市	小谷木橋	(H24 新規) 施工準備	用地買収		用地・工事の推進						
			(一) 遠野住田線 (ICへアクセスする道路)	遠野市	新里	(事業中)	★用地・工事の推進								
